

Ofício nº 2236/2022 – DICOM/DIEXP/DIPRE

Goiânia, 04 de maio de 2022.

A Sua Excelência o Senhor  
Rogério Oliveira da Cruz  
Prefeito de Goiânia  
Paço Municipal, Av. do Cerrado,  
nº 999, 5º andar, Park Lozandes  
74884-092 - Goiânia-GO

*Favor avaliar a possibilidade.*  
*05.05.22*  
*Pres. Hugo Cunha*  
*Rogério Cruz*  
**ROGÉRIO CRUZ**  
Prefeito de Goiânia

**Assunto: Solicitação de revisão do Plano de Gestão do Prestador – PGP do Contrato de Programa nº 8013/2019, celebrado entre o Município de Goiânia e a Saneago.**

Senhor Prefeito,

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Nota Técnica nº 250/2022 e anexos, que apresentam de forma detalhada e fundamentada, os impactos provocados pela Pandemia do Coronavírus (Covid-19), na realização dos investimentos previstos no Plano de Gestão do Prestador – PGP do Contrato de Programa nº 8013/2019.

2. Nos termos da Nota Técnica nº 250/2022, considerando a situação de excepcionalidade provocada pela Pandemia, crise global de saúde pública, caso de força maior, imprevisível, com reflexos diretos na contratação e execução das obras em razão dos aumentos de preços, escassez de insumos e incertezas no mercado da construção civil, faz-se necessária a revisão do PGP para garantir prazos e condições adequadas de cumprimento dos investimentos estabelecidos nesse instrumento de planejamento.

3. Dessa forma, considerando a superveniência das circunstâncias que levaram ao descompasso no cumprimento do planejamento de investimentos estabelecido através do PGP, solicitamos à Prefeitura de Goiânia, titular dos serviços, a alteração contratual para revisão de metas e prazos de obras do PGP, conforme Nota Técnica em anexo.

4. Ao ensejo, reafirmamos nosso compromisso com o município de Goiânia, promovendo investimentos necessários para continuidade da nossa prestação de serviços de forma contínua, adequada, eficiente, segura e em defesa ao meio ambiente, e colocamos a Superintendência de Expansão e Concessão à disposição, pelo telefone (62) 3243-3417, para prestar eventuais esclarecimentos e demandas futuras da população goianiense.

Atenciosamente,

**HUGO CUNHA**  
**GOLDFELD:003**  
**32844153**  
Assinado de forma digital por HUGO CUNHA  
GOLDFELD:00332844153  
Dados: 2022.05.05  
08:25:33 -03'00'

Hugo Cunha Goldfeld  
Diretor Comercial

**FERNANDO COZZETTI**  
**BERTOLDI DE**  
**SOUZA:66122066672**  
Assinado de forma digital por FERNANDO COZZETTI  
BERTOLDI DE  
SOUZA:66122066672  
Dados: 2022.05.04 17:15:11  
-03'00'

Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza  
Diretor de Expansão

**RICARDO JOSE** Assinado de forma digital  
por RICARDO JOSE  
**SOAVINSKI:420** SOAVINSKI:42004470020  
**04470020** Dados: 2022.05.05  
08:43:38 -03'00'

Ricardo José Soavinski  
Diretor-Presidente

---

**Tipo** NOTA TECNICA

**Número** 250/2022

**Data** 14/04/2022

**Interessado** SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

**Assunto** COVID-19. PLANO DE GESTÃO DO PRESTADOR . PLEITOS. - Impactos da Pandemia do Coronavírus na contratação e execução das obras de saneamento. Necessidade de revisão de prazos do PGP do Contrato de Programa de Goiânia.

---

# **Justificativas Técnicas para Revisão do Plano de Gestão do Prestador – PGP.**

## **Contrato de Programa nº 8013/2019 – Goiânia.**

---

Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3730 | diexp@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

## Índice

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. EXECUÇÃO DE OBRAS PREVISTAS NO PGP DE GOIÂNIA.....	3
2.1. NOTIFICAÇÕES N <sup>OS</sup> 01/2021 E 01/2022 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE GOIÂNIA.....	3
2.2. OS SEVEROS IMPACTOS DA PANDEMIA NAS OBRAS DE SANEAMENTO.....	4
2.2.1. Da Pandemia do Coronavírus (COVID-19).....	5
2.2.2. Dos Impactos da Pandemia na Contratação e Execução das Obras de Saneamento.....	6
2.2.3. Das Medidas de Enfrentamento Adotadas pela Saneago.....	16
2.3. IMPACTOS DA PANDEMIA NA FORÇA DE TRABALHO DA SANEAGO.....	17
2.4. REVISÕES DE PROJETOS ELÉTRICO POR ALTERAÇÃO DE NORMA TÉCNICA DA ENEL.....	19
3. INVESTIMENTOS REALIZADOS NAS OBRAS PREVISTAS NO PGP.....	20
4. A TEORIA DA IMPREVISÃO E AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.....	21
5. DA NECESSIDADE DE REVISÃO DO PGP.....	24
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDOS.....	26
7. ANEXOS.....	28

## 1. INTRODUÇÃO

A presente Nota Técnica apresenta os impactos provocados pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19) na contratação e execução de obras de saneamento no âmbito da Saneago que, conseqüentemente, gerou um descompasso no cumprimento de ações específicas (obras) previstas no Contrato de Programa nº 8013/2019, celebrado entre o Município de Goiânia e a Saneago.

## 2. EXECUÇÃO DE OBRAS PREVISTAS NO PGP DE GOIÂNIA

A Pandemia do Coronavírus (COVID-19) gerou uma crise global em saúde pública, afetando de forma jamais vista a vida humana e as atividades econômicas, incluindo o mercado da construção civil. Por consequência do cenário pandêmico e seus reflexos, a Saneago não se viu livre dos impactos provocados diretamente na execução dos investimentos programados em obras previstas no Plano de Gestão do Prestador – PGP, parte integrante do Contrato de Programa com o Município de Goiânia, celebrado cerca de 03 meses antes da decretação de emergência em saúde pública, conforme será detalhado a seguir.

### 2.1. NOTIFICAÇÕES NºS 01/2021 E 01/2022 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE GOIÂNIA

Por meio das Notificações nºs 01/2021 e 01/2022 a Agência de Regulação de Goiânia – AR notificou a Saneago pelo não cumprimento do Plano de Gestão do Prestador – PGP, no que se refere à implementação de investimentos (obras) na forma e prazos previstos no instrumento de planejamento (PGP).

A Notificação nº 01/2021 (processo nº 86388171) foi respondida através do Ofício nº 2425/2021<sup>1</sup>, que encaminhou as Notas Técnicas nºs 274/2021 e 347/2021 à Agência de Regulação de Goiânia – AR. Já a Notificação nº 01/2022 (processo nº 90095102) foi respondida através do Ofício nº 2028/2022<sup>2</sup>, que encaminhou a Nota Técnica nº 216/2022 com a manifestação da Saneago acerca dos itens pontuados pelo órgão regulador municipal na referida notificação.

Conforme teor das Notas Técnicas nºs 347/2021 e 216/2022, elaboradas pela Diretoria de Expansão e superintendências vinculadas, ressaltamos que o descompasso observado no cumprimento

1 A Notificação nº 01/2021 – AR foi respondida através do processo administrativo Saneago nº 4700/2021.

2 A Notificação nº 01/2022 – AR foi respondida através do processo administrativo Saneago nº 4098/2022.

dos prazos de obras previstas no PGP ocorreram, principalmente, pelos efeitos provocados pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19) na contratação e execução das obras de saneamento básico da Saneago. Tais efeitos, ocasionados por evento de força maior, extraordinário e imprevisível, impactaram diretamente no planejamento e cronograma de implantação estabelecido no PGP.

Posto isso, de forma objetiva, tem-se que os investimentos previstos no PGP para os anos de 2020 e 2021 não foram concretizados na totalidade prevista em razão dos severos impactos causados pela COVID-19 no mercado da construção civil, que engloba as obras de infraestrutura urbana voltadas ao saneamento básico.

Conforme respostas apresentadas pela Saneago à Agência de Regulação de Goiânia e trazidas no presente documento, resta claro e fundamentado que tais impactos, ocasionados por evento de força maior, extraordinário e imprevisível, impediram o cumprimento de ações previstas PGP, fato que justifica e enseja a revisão dos prazos de obras (investimentos) estabelecidos no Plano vigente.

## 2.2. OS SEVEROS IMPACTOS DA PANDEMIA NAS OBRAS DE SANEAMENTO

O Contrato de Programa nº 8013/2019 foi celebrado em **17 de dezembro de 2019** e, em menos de **03 (três) meses** após sua assinatura, nos deparamos com a maior crise mundial de saúde pública, com situação de emergência oficialmente declarada, com impactos jamais vistos na saúde humana e nas atividades econômicas de modo geral, incluindo neste último a execução das obras de saneamento básico.

Nesse contexto, a pandemia em escala global constitui-se num fato excepcional, superveniente e imprevisível, estranho à vontade das partes (Saneago e Município de Goiânia) e que, pela magnitude e severidade de sua repercussão, alterou fundamentalmente as condições de execução dos investimentos nos prazos previstos no PGP que integra o Contrato de Programa nº 8013/2019.

Na prática, no âmbito da Saneago, a Pandemia trouxe graves impactos na contratação e execução das obras dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, afetando todo o planejamento de obras e investimentos estabelecido através do PGP. Nesse período, houve uma quantidade jamais vista de licitações não exitosas (desertas ou fracassadas), fato que evidenciou a aversão das empresas do ramo ao risco de não conseguirem honrar as obrigações advindas de novos contratos, uma vez que, para consecução dos objetos em contratação, seria necessário lidar com o hostil cenário estabelecido no mercado da construção civil e setor de saneamento: bruscas elevações de preços e escassez de insumos.

### 2.2.1. Da Pandemia do Coronavírus (COVID-19)

Desde o início de 2020, o mundo se deparou com a Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e os seus desdobramentos, que, infelizmente, mantêm-se até o presente momento como a maior crise sanitária mundial. Os dados oficiais informam que o número de óbitos pelo mundo já ultrapassa os **6,17<sup>3</sup> milhões de pessoas**, sendo que somente no Brasil mais de **660 mil vidas** já foram ceifadas em consequência da COVID-19.

No Brasil, a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de **03 de fevereiro de 2020**, declarou emergência em saúde pública de importância nacional. No Estado de Goiás, a situação de emergência na saúde pública foi decretada desde **13 de março de 2020**, por meio do Decreto Estadual nº 9.633/2020, situação que permanece até o momento atual, uma vez que a situação de emergência no Estado encontra-se decretada até **30 de abril de 2022 (Decreto nº 10.019, de 29 de dezembro de 2021)**. Ou seja, oficialmente, têm-se que a situação de emergência em razão da Pandemia já perdura por mais **de 02 (dois) anos**.

A crise gerada pela Pandemia acarretou desafios que vão muito além daqueles relacionados à saúde pública, proporcionando um clima de grandes incertezas quanto ao seu real impacto nos setores produtivos e econômicos da sociedade. Além de milhares de mortes, a pandemia provocou diversas limitações nas atividades econômicas (fechamento de indústrias e comércios, demissões em massa de trabalhadores, paralisações ou restrições logísticas de mercadorias), variações bruscas nos preços de mercado, escassez de materiais e produtos e, conseqüentemente, a necessidade de adoção de medidas para enfrentamento da realidade vivenciada neste momento.

A Pandemia, de magnitude mundial, se configura como fator claramente caracterizado no âmbito dos eventos de força maior, que não podem ser controlados, evitados ou impedidos pelo ser humano.

No âmbito da execução dos contratos administrativos de obras públicas, o momento pandêmico tem imposto alterações que vão desde a necessidade de adequação nas estruturas de canteiros e nas atividades executivas, minimizando os riscos de contágio, até a indisponibilidade e encarecimento repentino de insumos, onerando os custos de produção, impondo a desaceleração ou, até mesmo, a descontinuidade de sua execução.

### 2.2.2. Dos Impactos da Pandemia na Contratação e Execução das Obras de Saneamento

3 Fonte: WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data. Disponível em <https://covid19.who.int/>. Acessado em 08/04/2022.

As obras de saneamento foram gravemente afetadas pelos efeitos da pandemia, principalmente em decorrência dos aumentos de preços e escassez dos seus principais insumos, dos quais podemos destacar: materiais hidráulicos em geral, tubos e conexões em PVC, produtos de metalurgia (tubos e conexões em aço e ferro fundido, vergalhões de aço para estruturas), máquinas e equipamentos em geral (principalmente os engenheirados, ou seja, aqueles equipamentos específicos resultantes de projeto de engenharia, feitos sob medida para determinada aplicação, como por exemplo a maioria das bombas utilizadas nas grandes estações elevatórias de água e esgoto), materiais elétricos, entre outros.

Com os impactos da pandemia desde o início de 2020, a Saneago não se viu livre dos seus efeitos, seja na execução das obras por parte de suas contratadas ou, também, na contratação de novas obras previstas nos contratos de prestação de serviços que a Companhia possui com grande parte dos municípios do Estado de Goiás.

Nas obras contratadas e em andamento, os principais efeitos experimentados foram: pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, paralisações de obras pelas empresas contratadas (a revelia da determinação desta Companhia) e o descumprimento de cronograma por escassez de materiais e equipamentos no mercado.

Além disso, esse cenário de fortes variações de preços e falta de produtos trouxe diversas incertezas no mercado da construção civil, fato que, desde então, tem causado aversão das empresas do ramo (saneamento) ao risco de assumir novos contratos. Com isso, tem ocorrido com frequência a frustração em diversos certames licitatórios para contratação de obras e serviços de engenharia voltados à implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de saneamento operados pela Saneago. Importante ressaltar que esses impactos estão sendo registrados também não só em outras companhias de saneamento em diversos estados do Brasil, como em toda a Administração Pública, nos mais diversos campos de atuação.

Com vistas à demonstrar a brusca elevação de preços ocorrida após o início da pandemia, a **Figura 01** apresenta a variação anormal dos índices setoriais específicos dos principais insumos empregados nas obras de saneamento, em relação à tabela referencial da Saneago de Fev/2019. A forte oscilação de preços observada a partir do início do segundo semestre de 2020 coincide com o período em que diversas licitações da Saneago não lograram êxito.



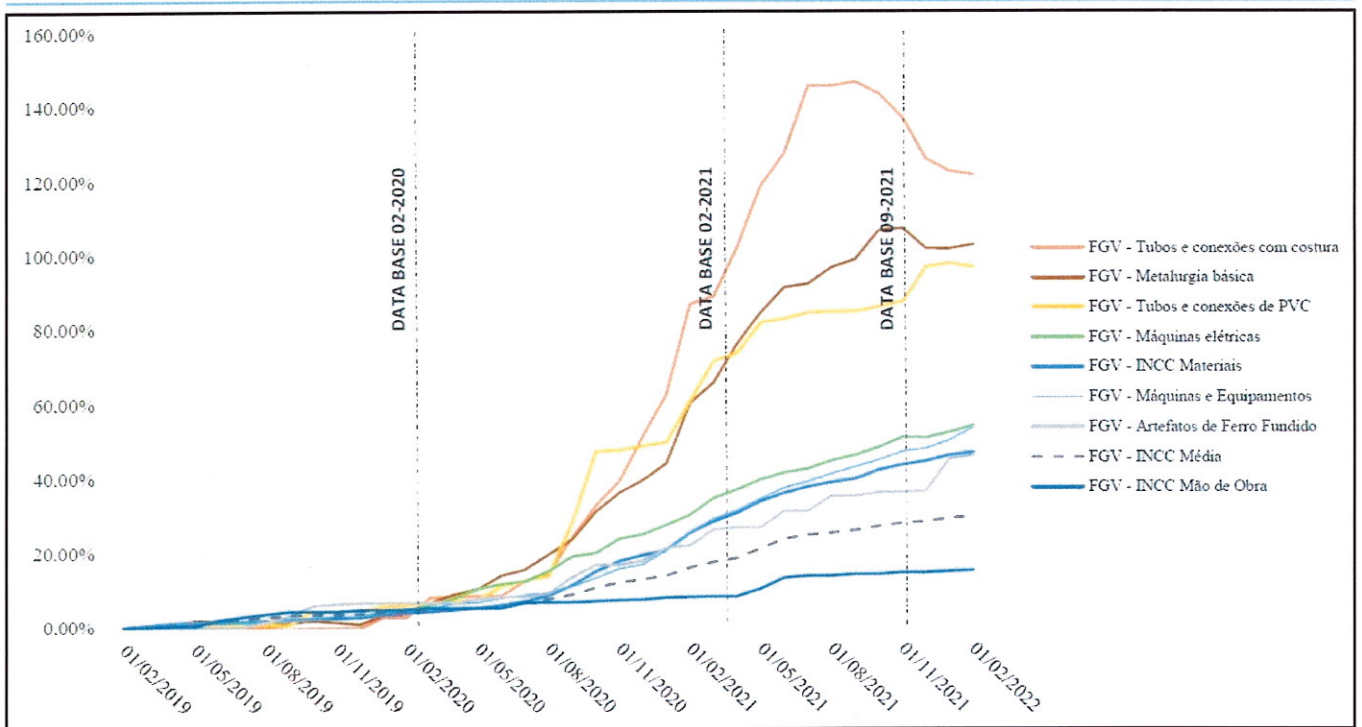


Figura 01. Variação de índices dos principais insumos utilizados nas obras de saneamento, após Fev/2019 (FGV).

Entre o período de Fev/2019 e Fev/2020 (datas-base das tabelas referenciais de preços da Saneago) observa-se comportamento normal dos principais insumos utilizados nas obras de saneamento, com variação inferior a 10% no período de 12 meses, fazendo com que o índice “INCC Médio” reajustasse adequadamente todos os preços de um contrato de obras. No entanto, com a situação de emergência declarada a partir de Mar/2020 em razão da Pandemia, nos meses subsequentes ocorreu uma elevação abrupta dos preços desses insumos, com alguns deles variando mais de 100% em um período de 12 meses, demonstrando o momento de excepcionalidade vivenciado.

Corroborando a informação do aumento de preços refletida pelos índices da Fundação Getúlio Vargas, apresentados na **Figura 01**, colacionamos a seguir diversas matérias jornalísticas, algumas delas de fontes especializadas do mercado da construção civil, que demonstram a realidade de alta de preços e falta de materiais que tem sido experimentada neste momento pandêmico.

## Construção: Alta de preços e falta de insumos são maiores riscos na retomada

Dados divulgados pela Cbic mostram que, mesmo com desafios, o PIB do setor em 2021 deve crescer 4%

Fonte: CNN Brasil. Editorial Business. Data: 17/12/2020. (Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/construcao-alta-de-precos-e-falta-de-insumos-sao-maiores-riscos-na-retomada/>).

AGENCIA CBIC

25/01/2021

### Insumos: falta e aumento dos preços são os principais problemas da construção



Dados da Sondagem Indústria da Construção de dezembro de 2020, divulgada nesta segunda-feira (25) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), indicam que **a falta e o aumento dos preços dos insumos são os principais problemas da construção.**

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC. Data: 25/01/2021. (Disponível em: [https://cbic.org.br/es\\_ES/insumos-falta-e-aumento-dos-precos-sao-os-principais-problemas-na-construcao/](https://cbic.org.br/es_ES/insumos-falta-e-aumento-dos-precos-sao-os-principais-problemas-na-construcao/)).

AgênciaBrasil



© Elza Fritza/Agência Brasil

Economia

## Aumento no preço de insumos para construção civil preocupa o setor

Fonte: Empresa Brasil de Comunicação – EBC. Agência Brasil. Data: 22/02/2021. (Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-02/alta-no-preco-de-insumos-para-construcao-civil-preocupa-cbic>).

AGÊNCIA CBIC

07/04/2021

## Bate recorde aumento no custo com materiais e equipamentos da construção

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC. Data: 07/04/2021. (Disponível em: <https://cbic.org.br/bate-recorde-aumento-no-custo-com-materiais-e-equipamentos-da-construcao/>).

**AGENCIA CBIC**

09/04/2021

**Sinapi revela persistência do aumento dos materiais de construção**

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC. Data: 09/04/2021. (Disponível em: [https://cbic.org.br/es\\_ES/sinapi-revela-persistencia-do-aumento-dos-materiais-de-construcao/](https://cbic.org.br/es_ES/sinapi-revela-persistencia-do-aumento-dos-materiais-de-construcao/)).

**Preço do aço tem alta de mais de 100% e preocupa construção civil**

Alta da matéria-prima brasileira começa a impactar no valor de imóveis e pode causar atrasos em entregas de obras

17/05/2021 - 22:25

Fonte: Jornal O Popular. Editorial Economia. Katherine Alexandria. Data: 17/05/2021. (Disponível em: <https://www.opopular.com.br/noticias/economia/pre%C3%A7o-do-a%C3%A7o-tem-alta-de-mais-de-100-e-preocupa-constru%C3%A7%C3%A3o-civil-1.2252060>).

**Alta dos preços de materiais pode levar à paralisação de obras públicas; leia análise**

A falta de insumos de construção e o aumento dos custos colocam em risco os contratos em projetos de infraestrutura do poder público

Ruyter Kepler Thuin\*, O Estado de S.Paulo  
22 de julho de 2021 | 05h00


Fonte: Jornal Estadão. Ruyter Kepler Thuin. Data: 22/07/2021. (Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,alta-precos-materiais-construcao-paralisacao-obras-publicas-analise-sinduscon,70003785756>).

**Acima da Inflação**

Aumento de preços e falta de insumos da construção civil ameaçam obras públicas e trazem mais consequências; veja

terça-feira 31 agosto 2021 11:20 --- Por Aline Oliveira Carlêto ---


Fonte: Jornal Opção. Aline Oliveira Carlêto. Data: 31/08/2021. (Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/aumento-de-precos-e-falta-de-insumos-da-construcao-civil-ameaca-obras-publicas-e-traz-mais-consequencias-veja-349460/>).

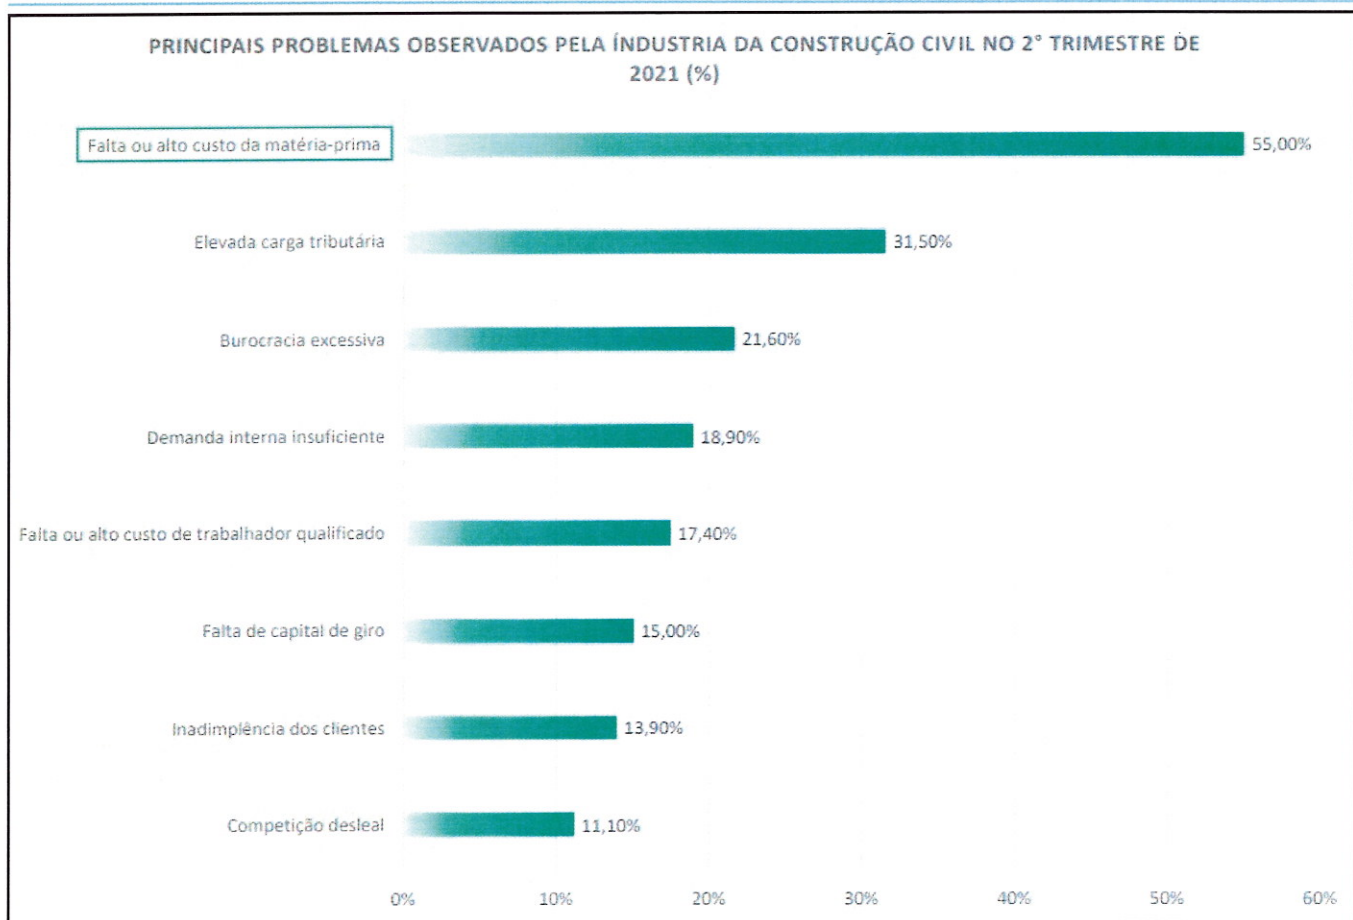

Fonte: Sondagem da Indústria da Construção, 2º Trim/21 – Confederação Nacional da Indústria – CNI. Adaptado do Informativo Econômico – CBIC (10/08/2021). (Disponível em: <https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2021/08/informativo-economico-incc-e-sinapi-agosto-2021.pdf>).

13/12/2021

## Aumento persistente no custo da construção é principal marca de 2021, diz CBIC

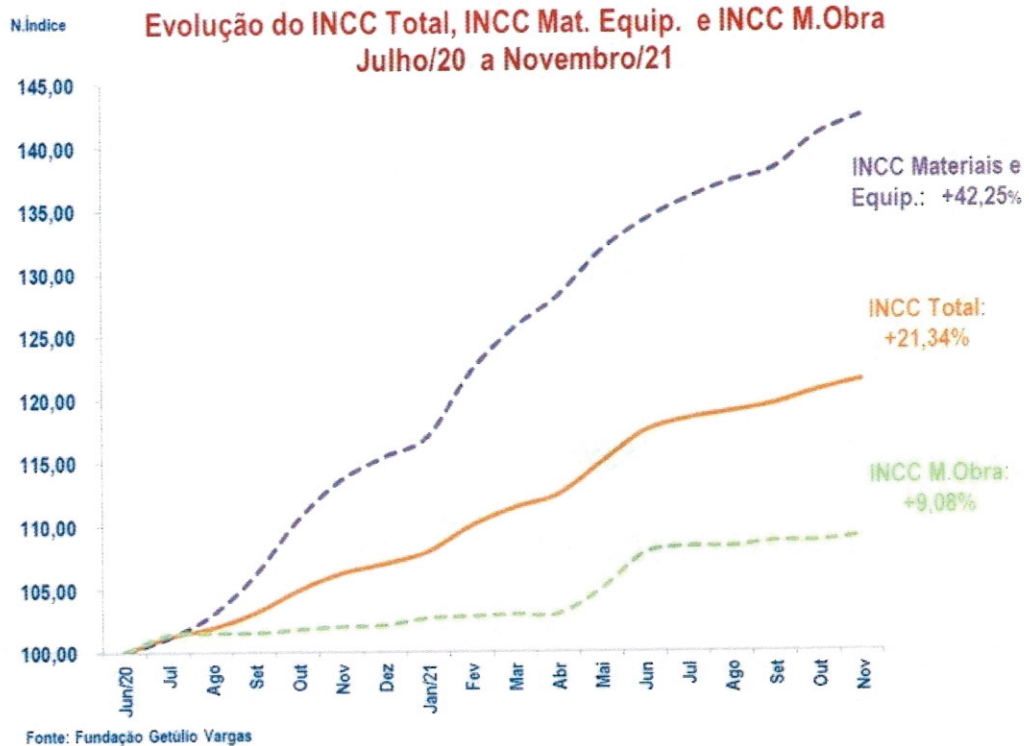

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC. Data: 13/12/2021. (Disponível em: <https://cbic.org.br/aumento-persistente-no-custo-da-construcao-e-principal-marca-de-2021-diz-cbic/>).

Como dito, todas as publicações de editais licitatórios de obras de 2020 se deram no segundo semestre, basicamente a partir de julho, e, por conseguinte, as datas de abertura das propostas se deram entre os meses de setembro e outubro, quando o mercado da construção civil experienciou os reflexos da pandemia por meio de expressivas distorções de preços e prazos de entrega de insumos, materiais e equipamentos. Tal cenário causou aversão das empresas do ramo (saneamento) ao risco de assumir novos contratos, além de comprometer a exequibilidade dos orçamentos elaborados e concluídos pela Administração até meados de 2020, baseados nas Tabelas de Preços vigentes na Saneago, com data-base Fev/2019 ou Fev/2020, ambas referências anteriores à pandemia.

Toda essa crise no setor de construção civil causou um alto índice de frustrações nas licitações, seja pela não apresentação de propostas (**licitação deserta**), seja pela apresentação de

Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3730 | diexp@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

propostas com preço acima do valor estimado pela Saneago (**licitação fracassada**). Portanto, resta configurado o nexo causal dos efeitos da pandemia do COVID-19 na variação anormal dos preços de mercado e, conseqüentemente, no insucesso nas contratações das obras de saneamento pela Saneago.

Faz-se mister ressaltar que, antes da pandemia, em 2019 a Saneago publicou certames e contratou obras com base em orçamentos em sua tabela referencial de Fev/2017, com descontos expressivos. Como exemplo, citamos o contrato nº 30000256/2019, de execução de redes coletoras de esgoto na região noroeste de Goiânia, assinado em 01/11/2019, com 21,01% de desconto em relação ao orçamento referencial da Saneago na data-base Fev/2017.

Desde o início da Pandemia, dos **46 (quarenta e seis)** certames publicados e que já tiveram a abertura de propostas, **31 (trinta e uma)** deles não tiveram êxito (deserta ou fracassada), enquanto **15 (quinze)** certames foram exitosos, dos quais **6 (seis)** referem-se a obras no município de Goiânia. Desse modo, ficaram comprometidos os prazos estimados para cumprimento de ações em diversos municípios. Essas informações também podem ser acessadas através do portal de Licitações e Fornecedores da Saneago, disponível em <https://www.saneago.com.br/#/fornecedores> (licitações em andamento ou concluídas).

Dos **31 (trinta e um)** certames não exitosos para contratação de obras em diversos municípios de Goiás, **09 (nove)** deles referem-se a obras no município de Goiânia, conforme relacionados na **Tabela 01**, cujos respectivos extratos de publicação de resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE/GO) constam no **ANEXO I**.

Tabela 01. Licitações não exitosas de obras para Goiânia, durante o período da pandemia.

Nº	SISTEMA	OBJETO	PROC. LICITATÓRIO	VALOR DO INVESTIMENTO	ABERTURA PROPOSTAS	RESULTADO
1	ÁGUA	ADUTORA ETAG/SENAC (LOTE 1)	18600/2018	R\$ 12.330.784,50	10/09/2020	DESERTA
2	ÁGUA	REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS SETORES FINSOCIAL, CURITIBA E SÃO DOMINGOS E ADJACENTES (LOTE 3)	3010/2018	R\$ 5.228.109,95	24/09/2020	FRACASSADA
3	ÁGUA	BOOSTER ETAG (LOTE 1A)	19693/2017	R\$ 14.269.513,98	03/11/2020	DESERTA
4	ÁGUA	BOOSTER E ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO DA AAT JOÃO LEITE AO CR CRISTINA (CONEXÃO CRISTINA)	15715/2019	R\$ 35.103.104,85	26/11/2020	FRACASSADA
5	ÁGUA	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO CRISTINA - RESERVATÓRIO APOIADO 10.000 M³	7135/2020	R\$ 4.905.832,05	26/03/2021	FRACASSADA

Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3730 | diexp@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

6	ESGOTO	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ENERGIZAÇÃO DA ETE DR. HÉLIO SEIXO DE BRITTO, EM 13,8 KV	2154/2021	R\$ 3.531.669,45	17/06/2021	DESERTA
7	ÁGUA	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO CRISTINA - RESERVATÓRIO APOIADO 10.000 M³	7135/2020	R\$ 6.411.902,33	09/09/2021	FRACASSADA
8	ÁGUA	BOOSTER E ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO DA AAT JOÃO LEITE AO CR CRISTINA (CONEXÃO CRISTINA)	15715/2019	R\$ 55.339.792,43	06/10/2021	FRACASSADA
9	ÁGUA	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO CRISTINA - RESERVATÓRIO APOIADO 10.000 M³	7135/2020	R\$ 7.327.702,67	31/03/2022	FRACASSADA

Alguns casos merecem destaque, pois retratam o momento de fortes aumentos de preços dos insumos utilizados nas obras de saneamento. Um deles é o da obra denominada “Conexão Cristina” (processo licitatório nº 15715/2019) que foi publicada na data-base Fev/2019 no valor de **R\$ 35.103.104,85**, com abertura de propostas em 26/11/2020 resultando em licitação fracassada. Posteriormente o orçamento foi atualizado de acordo com a tabela referencial da Saneago na data-base Fev/2021, perfazendo valor estimado de **R\$ 55.339.792,43**, resultando novamente em licitação fracassada em 06/10/2021, quando acudiu uma única proposta no valor de **R\$ 69.466.815,99**.

Outro caso bastante emblemático, é a contratação das obras de execução do Reservatório Cristina de 10.000 m³ (processo licitatório nº 7135/2020) que foi publicada inicialmente na data-base Fev/2020 no valor de **R\$ 4.905.832,05**. Ocorrida a abertura de propostas em 26/03/2021, a licitação foi fracassada. Posteriormente, o orçamento foi atualizado de acordo com a tabela referencial da Saneago na data-base Fev/2021, alcançando um valor estimado em **R\$ 6.411.902,33**, resultando novamente em licitação fracassada em 09/09/2021. O certame foi republicado com orçamento na data-base Set/2021 no valor de **R\$ 7.327.702,67**, conforme apresentado na **Figura 02**. Ou seja, em 07 (sete) meses houve aumento de quase **R\$ 1.000.000,00** no orçamento estimado pela Administração, demonstrando a persistência nas oscilações positivas nos preços dos insumos do setor de saneamento no ano de 2021. Mesmo com todas as medidas e atualizações implementadas no certame em questão, em 31/03/2022 foi realizada a abertura de propostas resultando em nova licitação fracassada.





Figura 02. Variação do orçamento estimado do processo licitatório nº 7135/2020 – CR Cristina.

No que se refere às obras para ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Goiânia, daquelas contratadas a partir de 2019, tem-se 03 (três) concluídas, 04 (quatro) em execução e 1 (uma) em que o contrato encontra-se em análise jurídica por indícios de apresentação de documentação irregular pela contratada. Os dados informados são apresentados na **Tabela 02**.

Tabela 02. Contratações de obras para o município de Goiânia, licitadas a partir de 2019.

Nº	SISTEMA	OBRAS	PROC. LICITATÓRIO	CONTRATO	VALOR	SITUAÇÃO
1	ÁGUA	BOOSTER CASCALHO	24283/2017	30000133/2019	R\$ 7.148.481,80	CONCLUÍDA
2	ESGOTO	REDES COLETORAS NO JARDIM NOVA ESPERANÇA, JARDIM PETRÓPOLIS E ADJACÊNCIAS (REGIÃO NOROESTE)	24292/2017	30000256/2019	R\$ 16.099.251,05	CONCLUÍDA
3	ÁGUA	CENTROS DE RESERVAÇÃO CURITIBA I E II (LOTE 4)	24283/2017	30000310/2020	R\$ 5.028.417,54	CONCLUÍDA
4	ÁGUA	ADUTORA ETAG/SENAC (LOTE 1)	18600/2018	30000241/2021	R\$ 15.045.550,13	EM EXECUÇÃO
5	ESGOTO	REDES COLETORAS NAS BACIAS CAVEIRINHA E MEIA PONTE NORTE (REGIÃO NOROESTE)	6976/2020	30000287/2021	R\$ 27.499.706,01	EM EXECUÇÃO
6	ÁGUA	LINHÃO GYN APA - TRECHO 1: ELEVATÓRIA SENAC, DUPLICAÇÃO DA ADUTORA SENAC/LESTE-CÉLG E INTERLIGAÇÃO NO	11846/2020	30000383/2021	R\$ 48.020.344,16	EM EXECUÇÃO

		RESERVATÓRIO LESTE-CELG				
7	ÁGUA	REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS SETORES FINSOCIAL, CURITIBA, SÃO DOMINGOS E ADJACÊNCIAS (LOTE 3)	3010/2018	30000344/2021	R\$ 7.753.900,93	CONTRATO EM ANÁLISE JURÍDICA
8	ESGOTO	REDES COLETORAS NA BACIA TAQUARAL - LOTE 1 - FASE 1 (REGIÃO SUDOESTE)	317/2021	30000406/2021	R\$ 14.124.418,62	EM EXECUÇÃO
					<b>R\$ 140.720.070,24</b>	

Além dos contratos elencados na Tabela 02, encontra-se em andamento as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Britto, com implantação de tratamento secundário. Já as obras de ampliação da ETE Parque Atheneu e de implantação do Intermediário Meia Ponte Jusante que estavam em execução, foram paralisadas em razão do abandono dos serviços pela empresa contratada e encerramento contratual. Neste caso, os serviços remanescentes serão contratados para proporcionar a conclusão dos objetos.

Atualmente existe 01 (uma) licitação publicada (Proc. 19693/2017 – Booster ETAG), conforme **ANEXO II**, com abertura de propostas em maio/2022. Além disso, existem diversos outros processos licitatórios de obras e aquisição de equipamentos (pregão eletrônico) em fase final de instrução interna, que serão publicados nos próximos meses, visando a execução de obras para ampliação e melhorias dos sistemas de água e esgoto do município de Goiânia.

Os dados apresentados demonstram que a Saneago não permaneceu inerte na busca pela contratação e execução das obras previstas em seus contratos de prestação de serviços de saneamento. Pelo contrário, mesmo com todas as limitações e restrições impostas, a Companhia lançou diversos certames que, na sua maioria, não foram exitosos pelos efeitos provocados pela própria Pandemia.

### 2.2.3. Das Medidas de Enfrentamento Adotadas pela Saneago

A Saneago, através da Diretoria de Expansão – DIEXP, implementou medidas visando mitigar o risco de frustrações em suas contratações de obras. Dentre essas medidas, destacamos:

- a) Reajustamento dos contratos pela data-base do orçamento da Administração, em vez da adoção da data de apresentação da proposta;
- b) Reajustamento dos contratos por índices setoriais específicos, de acordo com a

representatividade de cada índice no orçamento de cada contratação;

- c) Revisão de cronogramas em consonância com os novos prazos de fornecimento e entrega dos materiais e equipamentos praticados pelo mercado neste momento de pandemia;
- d) Antecipação na publicação da Tabela Saneago na data-base Fev/2021, visando englobar os aumentos experimentados no segundo semestre de 2020;
- e) Alteração no fluxo processual interno das licitações, possibilitando prévias mitigações no orçamento paradigma antes da publicação, quando necessário;
- f) Parcelamento de itens representativos (materiais hidráulico e equipamentos) para aquisição e fornecimento pela própria Saneago, quando conveniente;
- g) Elaboração da Tabela Saneago na data-base Set/2021;

As medidas implementadas surtiram efeito positivo, visto que nas aberturas de propostas de certames licitatórios, ocorridas no 2º semestre de 2021 e início de 2022, na sua grande maioria, têm acudido interessados com a apresentação de propostas válidas, **proporcionando êxito nos processos de contratação das obras.**

### 2.3. IMPACTOS DA PANDEMIA NA FORÇA DE TRABALHO DA SANEAGO

Além dos impactos na contratação das obras, a Pandemia também afetou diretamente a força de trabalho da Saneago, conseqüentemente, com reflexos na produtividade das atividades internas.

Para reduzir a disseminação do coronavírus, houve a necessidade de implementação de teletrabalho para algumas atividades e áreas, que, de certo modo, comprometeu inicialmente o fluxo de trabalho das equipes diante da necessidade de adaptações a essa nova realidade. No entanto, para manutenção dos serviços públicos essenciais prestados pela Companhia.

Desde a decretação de situação de emergência em saúde pública em razão da Pandemia, a Saneago constituiu a Comissão de Crise, Acompanhamento e Combate à Propagação do Coronavírus<sup>4</sup>,

---

<sup>4</sup> Comissão constituída pela Resolução da Diretoria nº 12/2020, de 16 de março de 2020.

para monitorar e propor medidas a serem implantadas no âmbito interno, acompanhando às orientações dos órgãos de saúde pública e atendimento às determinações emanadas dos decretos estaduais.

Apresentamos a seguir alguns dos principais dados monitorados pela referida Comissão, que demonstram graficamente os impactos da pandemia na força de trabalho da Saneago.

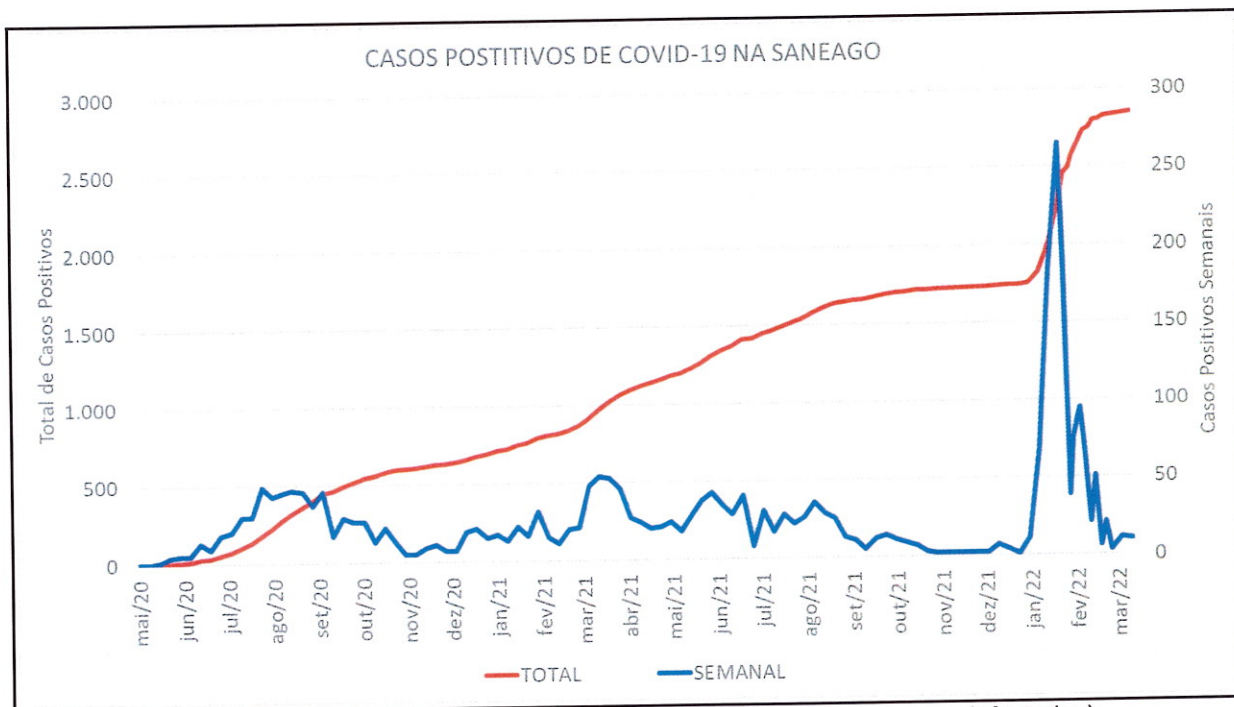


Gráfico 01. Quantidade de casos positivos de Covid-19 (infectados e re infectados).



Gráfico 02. Total de empregados afastados relacionados à Covid-19.




Gráfico 03. Total de casos de Covid-19, em empregados, até 14/03/2022.

Vale mencionar que, mesmo com os diversos impactos causados pela Pandemia, nesse período, a Saneago assumiu os ônus de inadimplência dos clientes, não realizando interrupção no abastecimento de água e coleta de esgoto, haja vista a imprescindibilidade do saneamento básico para auxiliar no

enfrentamento ao próprio momento pandêmico vivido pela população.

## 2.4. REVISÕES DE PROJETOS ELÉTRICO POR ALTERAÇÃO DE NORMA TÉCNICA DA ENEL

Boa parte dos sistemas de saneamento dependem de energia elétrica para seu funcionamento, principalmente as unidades de bombeamento, tanto de água quanto de esgoto.

Nessa senda, a Saneago possui um grande acervo de projetos elétricos relacionados às obras em contratação, projetos esses elaborados em conformidade com a Norma Técnica NTC-05 da Enel.

Ocorre que a citada concessionária de energia elétrica promoveu atualizações em suas normas, sendo que, em substituição à NTC-05, foi publicada, em **17/04/2020**, a 1ª versão da **Especificação Técnica nº 942 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição até 34,5 kV**. Já em **10/09/2021**, menos de 1 (um) ano e meio depois, foi publicada a 2ª versão da normativa. Naturalmente, tais alterações geraram a necessidade de revisão de diversos projetos elétricos e, conseqüentemente, a revisão dos respectivos orçamentos já elaborados, de modo a adequar o processo de contratação, garantindo condições adequadas de execução e energização das unidades que serão construídas ou ampliadas.

## 3. INVESTIMENTOS REALIZADOS NAS OBRAS PREVISTAS NO PGP

A Saneago se planejou para a implantação das obras na forma e prazos previstos no PGP, no entanto, os reflexos da Pandemia, a necessidade de revisão de projetos elétricos devido à alterações de normas técnicas pela Enel e, também, questões relacionadas a regularizações fundiárias, comprometeram a execução das obras da forma planejada.

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas neste período, com reflexos diretos na performance de cumprimento do PGP, a Companhia continuou realizando investimentos na consecução das obras, conforme apresentado a seguir na **Tabela 03**, cujos dados detalhados encontram-se no **ANEXO III** e **ANEXO IV**.

Tabela 03. Investimentos realizados nas obras constantes no PGP.

SISTEMA	TIPO	INVESTIMENTOS REALIZADOS (R\$)				TOTAL
		ATÉ 2019	2020	2021	2022 (até Mar/2022)	
ÁGUA	OBRAS	214.008,58	6.278.353,81	6.730.895,88	1.331.495,07	<b>14.554.753,34</b>

Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3730 | diexp@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	17.777.586,80	0,00	0,00	0,00	<b>17.777.586,80</b>
	<b>Subtotal</b>	<b>17.991.595,38</b>	<b>6.278.353,81</b>	<b>6.730.895,88</b>	<b>1.331.495,07</b>	<b>32.332.340,14</b>
<b>ESGOTO</b>	OBRAS	16.643.727,35	43.787.085,88	24.219.282,73	7.782.333,41	<b>92.432.429,37</b>
	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	4.481.728,80	15.938.108,57	16.072.417,83	6.410.139,46	<b>42.902.394,66</b>
	<b>Subtotal</b>	<b>21.125.456,15</b>	<b>59.725.194,45</b>	<b>40.291.700,56</b>	<b>14.192.472,87</b>	<b>135.334.824,03</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39.117.051,53</b>	<b>66.003.548,26</b>	<b>47.022.596,44</b>	<b>15.523.967,94</b>	<b>167.667.164,17</b>

Conforme se observa, importante esclarecer que a tabela acima, bem como os ANEXOS III e IV, contemplam, também, alguns valores desembolsados pela Companhia antes da assinatura do contrato de Programa nº 8013/2019, em 17/12/2019, uma vez que naquele momento algumas das obras constantes no PGP encontravam-se em andamento, inclusive com materiais e equipamentos adquiridos e fornecidos pela própria Saneago para emprego na execução das obras.

#### 4. A TEORIA DA IMPREVISÃO E AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

É inegável que o setor da construção civil, no qual estão inseridas as obras de infraestrutura urbana de saneamento básico, está sofrendo até hoje, negativamente, por conta da crise provocada pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19). Nesse contexto, certo de que esta concessionária, em seu mister, deve acompanhar os efeitos negativos provocados pela aludida crise, para garantir a manutenção dos serviços públicos prestados e o cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Programa nº 8013/2019, celebrado em 17 de dezembro de 2019 com o Município de Goiânia.

Pode-se dizer que a Pandemia do Coronavírus configura força maior ou caso fortuito, caracterizando álea extraordinária para fins de aplicação da teoria da imprevisão a justificar a alteração do Contrato de Programa com a revisão de metas e prazos inicialmente previstos.

Nesse sentido, o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 8.666/1993 traz a previsão de alteração devidamente justificada. Vejamos:

*Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão **ser alterados**, com as **devidas justificativas**, nos seguintes casos:*

(...)

*II - por acordo das partes:*

(...)

*d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do*

contrato, na hipótese de **sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado**, ou, ainda, em caso de **força maior, caso fortuito** ou fato do príncipe, **configurando álea econômica extraordinária e extracontratual**. (grifamos)

Ainda, sobre a alteração de prazos de início, conclusão e entrega de etapas de execução de um contrato, a Lei Federal nº 8.666/1993 estabelece no art. 57, § 1º, inciso II:

§ 1º Os prazos de **início de etapas de execução, de conclusão e de entrega** admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, **desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo**:

(...)

**II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;** (grifamos)

Com relação a aplicação da teoria da imprevisão aos contratos de concessão de serviços públicos, esta foi a lição de Caio Tácito<sup>5</sup>:

*Embora aplicável a outros contratos administrativos, o terreno por excelência da **teoria da imprevisão** é a **concessão do serviço público**, cuja longa duração, associada à regra da continuidade do serviço, confere particular interesse à manutenção dinâmica do contrato. O estado de imprevisão indenizável deve ser anormal, imprevisível e intolerável.*

*A álea econômica é, por natureza, extraordinária, excedente aos riscos normais admitidos pela natureza do negócio.*

*Os fenômenos de instabilidade econômica ou social (guerras, crises econômicas, desvalorização da moeda) são as causas principais do estado de imprevisão, tanto pela importância do impacto de seus efeitos, como pela imprevisibilidade de suas consequências. A sua gênese poderá, no entanto, vincular-se a acontecimentos naturais (terremotos, inundações, incêndios, desmoronamentos), ou a intervenções administrativas ou legais (controle econômico, bloqueio de preços) que induzem a grave e inesperada rotura do equilíbrio financeiro do contrato.*

*A imprevisibilidade não se refere, necessariamente, ao elemento perturbador em si mesmo, mas aos seus efeitos que ultrapassem à razoável previsão humana.*" (grifamos)

Apenas eventos excepcionais justificariam a revisão de contratos com base na teoria da imprevisão. Para isso é imprescindível que se trate de: (i) evento superveniente e extraordinário; (ii) cuja ocorrência ou consequências sejam imprevisíveis e inevitáveis; e (iii) que tenha gerado um grande

5 Trecho citado no PARECER n. 261/2020/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU, cujos assuntos relacionados são: "ASSUNTOS: Consulta em tese. Covid-19. Reequilíbrio de contratos de concessão. Força maior." Disponível em: <<https://licitacao.paginas.ufsc.br/files/2020/03/Parecer-AGU-Concess%C3%A3o-Transportes-Recomposi%C3%A7%C3%A3o.pdf>>.



desequilíbrio no contrato, ou seja, uma onerosidade excessiva para uma das partes.

Diante disso, bem como do efetivo impacto do evento sobre o cumprimento de metas durante a execução das obras, resta avaliar se, em tese, a Pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2) poderia ser considerada como evento de força maior ou outra causa equivalente capaz de ensejar ao reequilíbrio de contratos de programa do setor de infraestrutura de saneamento básico, neste caso, para revisão de prazos de ampliação e melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário através de obras preestabelecidas em contrato.

Embora haja distinções doutrinárias entre “força maior” e “caso fortuito”, suas consequências jurídicas, em regra, são as mesmas. Nesse cenário, não há muita utilidade em distinguir esses conceitos. O próprio Código Civil, no parágrafo único do seu art. 393, estabelece genericamente que “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”:

*“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.*

*Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” (grifamos)*

Sobre o caso fortuito e a força maior, Sílvio de Salvo Venosa<sup>6</sup> explica o seguinte:

*O parágrafo único do artigo em questão [art. 393 do Código Civil] conceitua o **caso fortuito** e a **força maior** como o fato necessário, cujos efeitos não são possíveis evitar, ou impedir. A lei equipara, portanto, os dois fenômenos.*

*Para o código, **caso fortuito e força maior são situações invencíveis, que refogem às forças humanas**, ou às forças do devedor, impedindo e impossibilitando o cumprimento da obrigação. É o inadimplente que deve provar a ocorrência desses fatos.*

*Há dois elementos a serem provados, um de índole objetiva, que é a **inevitabilidade do evento**, e outro de índole subjetiva, isto é, **ausência de culpa**. Deve o devedor provar que o **evento surpreendente não poderia ter sido previsto ou evitado**. (grifamos)*

Por conseguinte, parece natural que a Pandemia seja classificada como evento de “força maior” ou “caso fortuito”. É certo que, em resposta à disseminação da doença, foram adotadas medidas de restrição e mesmo de suspensão de atividades econômicas. Tais medidas poderiam eventualmente ser classificadas como “fato do príncipe”. Porém, há de se reconhecer que a sua causa foi exatamente o potencial de disseminação do vírus e, neste caso, seus impactos sobre a implementação das obras de saneamento

<sup>6</sup> VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 254.

básico. Além disso, não há na prática maior relevância em tentar distinguir se eventual prejuízo sobre os contratos de programa seria decorrente de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, pois, em regra, suas consequências jurídicas seriam as mesmas.

O que importa é reconhecer que o elemento causador do distúrbio econômico, ainda que indiretamente, consistiu claramente num evento da natureza (mutação e rápida disseminação de um vírus com taxa de letalidade relativamente alta considerando os números globais), sendo que esse evento, ou pelo menos, os seus efeitos não poderiam ter sido previstos ou antecipados pelos concessionários de serviço público de tratamento e fornecimento de água e esgotamento sanitário e tampouco poderiam ter sido por eles evitados. Por conseguinte, resta muito claro que a Pandemia do Coronavírus (SARS-CoV-2) trata-se de um evento que caracteriza “álea extraordinária”, capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

A teoria da imprevisão é aplicável aos contratos administrativos, incluindo os contratos de programa, neste caso, respeitadas as suas características próprias e a alocação de riscos prevista explícita ou implicitamente no respectivo instrumento contratual. Mas, para isso, é imprescindível que se trate de evento superveniente e extraordinário, cuja ocorrência ou consequências sejam imprevisíveis e inevitáveis e que tenha gerado um significativo desequilíbrio no contrato, sendo necessário, para que haja um equilíbrio na relação contratual, que seja estabelecida novas metas, para que haja tempo hábil para o cumprimento das obrigações anteriormente assumidas.

O Contrato de Programa nº 8013/2019 estabelece em sua Cláusula Sétima, referente a objetivos e metas, que “§ 2. *Toda e qualquer revisão e ajuste da metas iniciais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário poderá ensejar alterações neste contrato, desde que fundamentada tecnicamente e aprovada em audiência pública conduzida pelo conselho de saneamento de Goiânia e pelo conselho de regulação, com a perspectiva de assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da prestação, ou para promover a articulação e adequação com planejamento e as metas do município e no contexto da prestação dos serviços na Região Metropolitana de Goiânia – RMG*”.

## 5. DA NECESSIDADE DE REVISÃO DO PGP

Conforme detalhadamente exposto, os impactos provocados pela Pandemia na contratação e execução das obras de saneamento se concretizou como fato impeditivo ao cumprimento dos prazos de obras previstas no PGP do Contrato de Programa de Goiânia, firmado com o Município em 17/12/2019, ou seja, cerca de **03 (três) meses antes da decretação de situação de emergência na saúde pública.**

---

Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3730 | diexp@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

No Brasil, a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de **03 de fevereiro de 2020**, declarou emergência nacional em saúde pública. No Estado de Goiás, a situação de emergência na saúde pública foi decretada desde **13 de março de 2020**, por meio do Decreto Estadual nº 9.633/2020, situação que perdura declarada até **30 de abril de 2022 (Decreto nº 10.019, de 29 de dezembro de 2021)**. Ou seja, já tem mais de **02 (dois) anos** de situação de emergência oficialmente decretada em razão da Pandemia.

Resta demonstrado que os severos reflexos provocados nas contratações públicas resultaram em diversos insucessos nas licitações de obras da Saneago, afetando o planejamento técnico da Companhia. Por conseguinte, houve um descompasso no cumprimento dos prazos estabelecidos para o alcance da universalização dos serviços de abastecimento de água e a ampliação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário, respectivamente previstos nos Mapas 3 e 4 do PGP (Figuras 03 e 04). Esse descompasso decorre dos efeitos provocados no cronograma de implantação de obras estruturais previstas no PGP de Goiânia (Tabelas 8 e 11 do PGP), justificando a necessidade de revisão dos prazos inicialmente estabelecidos.

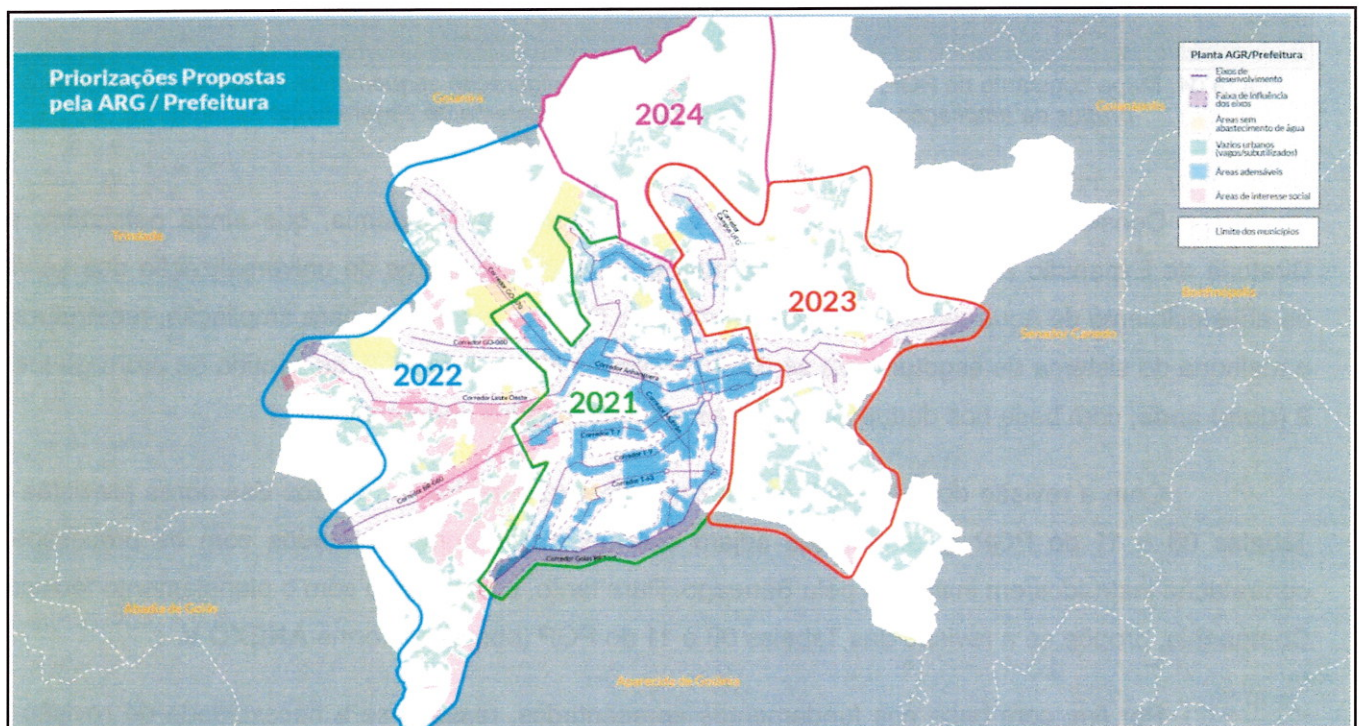


Figura 03. Mapa constante no PGP, denominado “Mapa 3 – Configuração esquemática das regiões e respectivos prazos para o alcance da universalização dos serviços de abastecimento de água”.

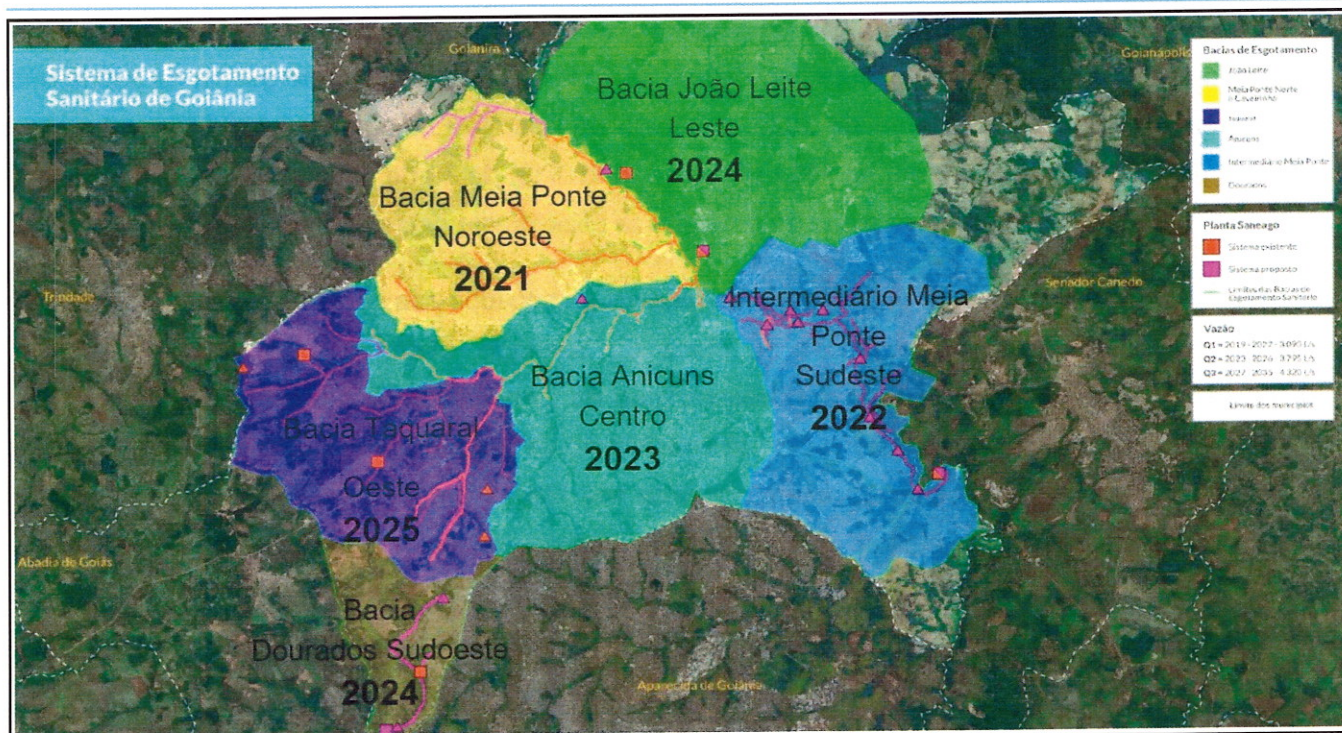


Figura 04. Mapa constante no PGP, denominado “Mapa 4 – Configuração esquemática das regiões e respectivos prazos de ampliação, reestruturação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário.”

Considerando o prazo de duração e os impactos da Pandemia, que ainda persistem, esta Diretoria de Expansão entende pela necessidade de revisão dos prazos de universalização dos serviços de abastecimento de água estabelecidos no Mapa 3 do PGP, e dos prazos para ampliação, reestruturação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário, conforme Mapa 4 do PGP, no sentido de prorrogá-los em **2 (dois) anos**, com base nos dados, justificativas e situação fática apresentada.

Com a revisão dos Mapas 3 e 4, faz-se necessário revisar os prazos das obras previstas nas Tabelas 08 e 11 do PGP e, ainda, que sejam oportunamente compatibilizados com os processos de contratação instruídos/em instrução pela Saneago. Para tanto, coadunando com o planejamento técnico da Companhia, propõe-se a revisão das Tabelas 08 e 11 do PGP (obras) conforme **ANEXO V**.

Por fim, com base nos fundamentos apresentados, ressalta-se a necessidade de revisão dos prazos do PGP, garantindo condições adequadas e factíveis para a execução das obras e investimentos programados para os sistemas de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário do Município de Goiânia.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDOS

Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3730 | diexp@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Considerando as Notificações nº 01/2021 e 01/2022 da Agência de Regulação de Goiânia – AR, alegando o não cumprimento do Plano de Gestão do Prestador - PGP, parte integrante do Contrato de Programa nº 8013/2019, respondidas pela Saneago com apresentação detalhada dos graves impactos provocados pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19) na contratação e execução das obras de engenharia, reiterados nesta Nota Técnica, que levaram ao descompasso no cumprimento das ações de investimentos nos prazos previstos no PGP;

Considerando que o descompasso na contratação e execução de algumas obras provoca o retardamento dos prazos de universalização do sistema de abastecimento de água e de ampliação, reestruturação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário, respectivamente estabelecidos nos Mapa 3 e 4 do PGP;

Considerando a necessidade de revisão do PGP para que a Saneago, diante dos descompasso provocado pela Pandemia, tenha condições de adequar seu planejamento e disponha de prazo adequado para implantação das obras que visam assegurar a necessária ampliação, melhoria e estruturação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Goiânia;

Considerando a necessidade de revisão dos mapas de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (Mapas 03 e 04) para fins de Análise de Viabilidade Técnico Operacional - AVTO, garantido prazos e condições técnicas adequadas de atendimento ao crescimento e desenvolvimento do Município de Goiânia;

Considerando a superveniência e excepcionalidade da situação vivenciada, e, por consequência disso, sujeitando a revisão excepcional das metas e prazos estabelecidos no PGP;

Considerando a Lei Federal nº 8.666/1993, art. 57, § 1º, II, e o art. 65, II, “d”, os quais estabelecem que os contratos regidos por esta Lei podem ser alterados, inclusive os prazos de suas etapas, com as devidas justificativas, em razão de superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, alterando fundamentalmente as condições de execução do contrato e que se configure álea extraordinária.

Pelo exposto, esta Diretoria de Expansão solicita ao Município de Goiânia:

**a)** Que os dados, informações e justificativas apresentadas nesta Nota Técnica sejam recepcionados e conhecidos pelo Município de Goiânia (poder concedente, titular dos serviços);

**b)** Que, restando caracterizada a situação de superveniência e excepcionalidade provocada pela Pandemia do Coronavírus (COVID-19), caso de força maior, imprevisível, que ocasionou impactos


diretos na contratação e execução das obras em razão dos aumentos de preços, escassez de insumos e incertezas no mercado da construção civil, com reflexos no planejamento técnico da Saneago, seja acatada a necessidade fundamentada de revisão/alteração do PGP;

c) Que seja promovida a revisão do PGP mediante prorrogação dos prazos dos Mapas 03 e 04 em 02 anos, e revisão das Tabelas 08 e 11 conforme proposta apresentada no ANEXO V, garantido prazos e condições factíveis de realização das obras e investimentos para universalização do sistema de abastecimento de água tratada e ampliação, melhorias e reestruturação do sistema de esgotamento sanitário de Goiânia.

Sendo essas as considerações e pedidos para o momento, reiteramos o esforço e comprometimento de toda a Diretoria de Expansão, e da Saneago, na contratação e execução das obras de ampliação e melhorias dos sistemas de saneamento e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e complementação de informações.

## 7. ANEXOS

- ANEXO I – Extratos de Publicação em Diário Oficial – Licitações desertas e fracassadas (conforme Tabela 01);
- ANEXO II – Avisos de Licitações - Publicação em Diário Oficial;
- ANEXO III – Relação de Investimentos Realizados referente a Obras Previstas no PGP de Goiânia;
- ANEXO IV – Relação de Investimentos em Aquisições de Materiais e Equipamentos para Obras Previstas no PGP de Goiânia;
- ANEXO V – Proposta de revisão das Tabelas 08 (SAA) e 11 (SES) do PGP.




Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3730 | diexp@saneago.com.br


Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

---


RAFAEL LEMOS TEIXEIRA - ASSESSOR TÉCNICO A1  
DIEXP - DIRETORIA DE EXPANSÃO em 14/04/2022 15:56:59



GIOVANNI BRETONES MORA - SUPERINTENDENTE A1  
SUESP - SUPERIN. DE ESTUDOS E PROJETOS em 14/04/2022 15:55:30



MAGNO ANTUNES LIMA CUPERTINO - SUPERINTENDENTE A2  
SUENG - SUPERINTENDENCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS em 14/04/2022 15:12:49



MARCO ANTONIO DE ANDRADE - SUPERINTENDENTE A1  
SUPOB - SUPERIN. GESTAO DE OBRAS em 14/04/2022 15:38:36



FERNANDO COZZETTI BERTOLDI DE SOUZA - DIRETOR (A)  
DIEXP - DIRETORIA DE EXPANSÃO em 14/04/2022 16:56:55





**ANEXO I – Extratos de Publicação em Diário Oficial –  
Licitações desertas e fracassadas (conforme Tabela 01).**





CIEE, inscrita no CNPJ sob o nº 61.600.839/0009-02, no valor de R\$ 133.600,44 nos termos do Art.29, Inciso VII, da Lei Federal 13.303/2016, conforme processo SEI nº 202000055000453, visando a aquisição de crachás de identificação.

Publique-se

**GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DA INDÚSTRIA  
QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. - IQUEGO, aos 28 dias  
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.**

Denes Pereira Alves  
Diretor Presidente

Protocolo 199544

## SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

### AVISO DE LICITAÇÃO

**Pregão Eletrônico nº 045/2020**

**Processo: 21277/2019 - Saneago**

**Modo de Disputa: ABERTO**

**Critério de Julgamento: MENOR PREÇO**

**Licitação** contemplando LOTE(S) destinado(s) à AMPLA PARTICIPAÇÃO, será realizada no sistema "Licitações-e" do Banco do Brasil S.A. no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM USO DE CAMINHÃO PIPA NOS DISTRITOS JURISDICIONADOS ÀS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SERVIÇOS (GRS's) DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES DO INTERIOR (SUINT) E DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES DO ENTORNO DO DF (SUENT), conforme disposições fixadas no Edital e Anexos.

**Recursos:** Próprios da Saneamento de Goiás S/A - Saneago.

**Data de Abertura: 23 (vinte e três) de outubro de 2020, às 09h (nove horas).**

O Edital poderá ser obtido no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Goiânia, 25 de setembro de 2020.

Ednilson Alves da Rocha

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 199493

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

**Procedimento Licitatório nº 15.3-003/2020**

**Processo: 18600/2018 - SANEAGO**

Licitação realizada no dia 10 (dez) de setembro de 2020 às 14h:30min (quatorze horas e trinta minutos).

**Objeto:** CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DUPLICAÇÃO DA ADUTORA ETAG/SENAC, NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS.

**Licitação Deserta** por não comparecerem interessados ao certame, conforme Ata constante do processo.

Goiânia, 18 de setembro de 2020.

Ednilson Alves da Rocha

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 198748

## TRIBUNAIS DE CONTAS

Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2020

**Processo nº:** 202000047001240. **Contratante:** Tribunal de Contas do Estado de Goiás. **Contratada:** MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda. **Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 016/2020. **Objeto:** Aquisição de licenças do Software Autodesk. **Fundamentação Legal:** Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e Lei Estadual nº 17.928/2012. **Classificação Orçamentária:** 2020 02 01 01 032 1001 2.001. **Grupo:** 03. **Natureza de Despesa:** 3.3.90.40.84. **Fonte:** 100. **Vigência:** 36 meses. **Valor total:** R\$ 166.200,00.

Protocolo 199500

## MINISTÉRIO PÚBLICO

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo:** 202000150734 **Licitação:** Pregão Eletrônico, Edital nº 069/2020, Contrato nº 105/2020 **Objeto:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados de forma continuada, de 01 (um) elevador instalado no prédio alugado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, sito à Rua 32, Qd. A-17, Lote 18, Setor Jardins Goiás, Goiânia-GO, destinado a abrigar diversos órgãos da área meio do MP-GO, incluindo o fornecimento, a instalação de peças, componentes, produtos e materiais de consumo, e deslocamento **Contratante:** Ministério Público do Estado de Goiás Procuradoria-Geral de Justiça **Contratada:** Empresa Brasileira de Elevadores Ltda. **Período:** 28/09/2020 a 27/09/2021 **Dotação Orçamentária:** 0701 03 091 4200 4.241 - GP/03 **Valor do Contrato:** R\$ 12.999,96 **Recurso:** Tesouro Estadual **Empenho:** nº 01039 de 28 de agosto de 2020 **Valor do Empenho:** R\$ 3.863,86 **Data de assinatura do Contrato:** 28/09/2020 **Amparo Legal:** Lei nº 8.666/93. Art. 61

Protocolo 199522

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo:** 202000079836 **Licitação:** Pregão Eletrônico, Edital nº 048/2020, Contrato nº 100/2020 **Objeto:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados de forma continuada, de 01 (um) elevador instalado no edifício sede das Promotorias de Justiça de Trindade-GO, incluindo o fornecimento e a instalação de peças, componentes, produtos e materiais de consumo **Contratante:** Ministério Público do Estado de Goiás Procuradoria-Geral de Justiça **Contratada:** Empresa Brasileira de Elevadores Ltda. **Período:** 28/09/2020 a 27/09/2021 **Dotação Orçamentária:** 0701 03 091 4200 4.241 - GP/03 **Valor do Contrato:** R\$ 12.000,00 **Recurso:** Tesouro Estadual **Empenho:** nº 01041 de 28 de agosto de 2020 **Valor do Empenho:** R\$ 3.566,61 **Data de assinatura do Contrato:** 28/09/2020 **Amparo Legal:** Lei nº 8.666/93. Art. 61

Protocolo 199523

### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

**Processo:** 202000275763 **Licitação:** Tomada de Preços, Edital nº 123/2019, Contrato nº 023/2020 **Objeto:** Acréscimo de valores, repactuação do cronograma físico-financeiro, prorrogação dos prazos de execução e de vigência do Contrato nº 023/2020 **Contratante:** Ministério Público do Estado de Goiás Procuradoria-Geral de Justiça **Contratada:** DCP Maia - R&D Engenharia Ltda. **Período:** 18/09/2020 a 20/03/2021 **Dotação Orçamentária:** 0701 03 091 4200 4.241 - GP/03 **Valor do Aditivo:** R\$ 2.478,91 **Recurso:** Tesouro Estadual **Empenho:** nº 01059 de 02 de setembro de 2020 **Valor do Empenho:** R\$ 2.478,91 **Data do Aditivo:** 18/09/2020 **Amparo Legal:** Lei nº 8.666/93, art. 61

Protocolo 199524

## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS AVISO DE LICITAÇÃO

**Pregão Eletrônico nº 101/2020**

**Menor Preço Global**

**Objeto:** Aquisição de detectores de metais tipo pórtico a serem utilizados no controle de acesso dos usuários dos edifícios-sede do Ministério Público do Estado de Goiás, conforme quantidade, condições e especificações constantes nesse Termo. O fornecimento inclui a entrega, montagem dos pórticos nos locais indicados pelo MPGO, configuração do equipamento e treinamento dos operadores para sua utilização.

**Abertura:** 15/10/2020 às 13h30min.

**Local:** [www.comprasnet.go.gov.br](http://www.comprasnet.go.gov.br)

**Informações:** Fone: (62) 3243-8331; e-mail: [cpl@mpgo.mp.br](mailto:cpl@mpgo.mp.br); endereço eletrônico: <https://intranet.mpggo.mp.br/sgoc/portal/processos/editais>; ou Rua 23, Qd.A6, Lts. 15/24, Jardim Goiás, Goiânia-GO, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00 horas.

Goiânia, 25 de setembro de 2020.

Cinthia Tattielle de França Rodrigues Lemos  
Pregoeira

Protocolo 199397

13	1	2024000197	GIUSLENO MENDES FORTALEZA	4774511 SSP GO	Luziânia	x	
14	2	2024001471	NAYANE MARINHO DA FONSECA	2698926 SSP DF	Luziânia	x	
15	1	2024000918	ARTHUR LOPES DE SOUZA	4140121 DGPC GO	Morrinhos	x	
16	1	2024000688	JOSÉ RICARDO PATRÍCIO DE SOUZA	17128840 SSP MG	Ouvidor	x	
17	1	2024003556	MARCOS RAFAEL MACHADO MARGARIDA	4924764 DGPC GO	Palmeiras de Goiás	x	
18	1	2024006078	JEFERSON JUNIOR MONTEIRO DE SOUZA	5736403 SSP GO	Porangatu	x	
19	1	2024000466	DEUZÉLIA MAURÍCIO SANTOS	5601704 SSP GO	Rio Verde	x	
20	1	2024003495	ISABELA RODRIGUES TEIXEIRA	6066641 SSP GO	Santa Helena de Goiás	x	
21	1	2024005265	CRISTIANO DA CONCEICAO RAMOS	458170537 SSP SP	São Luiz de Montes Belos	x	
22	1	2024001525	MARCIO PEDRO CARRIJO	4599681 DGPC GO	Ceres		x
23	1	2024003236	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	17294537 SSP MG	Goiânia		x
24	2	2024007265	MARCOS ANDRÉ DE ANDRADE SOARES	5744839 SSP GO	Goiânia		x

Goiânia-GO, 03 de Março de 2021.

Ricardo Jose Soavinski  
Diretor-Presidente

Silvana Canuto Medeiro  
Diretora de Gestão Corporativa

Olimpia Prata Neiva Parrode  
Superintendente de Recursos Humanos

Lyercia Lara Francisca de Araújo  
Gerente de Planejamento de Recursos Humanos

Protocolo 219661

**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
AVISO DE LICITAÇÃO**

**Pregão Eletrônico nº 078/2020**

**Processo:** 2366/2019 - Saneago

**Modo de Disputa:** ABERTO

**Critério de Julgamento:** MENOR PREÇO

**Licitação** contemplando LOTE(S) destinado(s) a AMPLA PARTICIPAÇÃO, EXCLUSIVO(S) e com RESERVA DE COTA à participação/ contratação de MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para aquisição de material(is) e/ou equipamento(s), será realizada no sistema "Licitações-e" do Banco do Brasil S.A. no site www.licitacoes-e.com.br

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO E EMULSÃO ASFÁLTICA, A SEREM APLICADOS NA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DAS OBRAS DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ANICUNS-GO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A., conforme disposições fixadas no Edital e Anexos.

**Recursos:** Próprios da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago.

**Limite de Acolhimento de Propostas:** 18/03/2021 às 08:00h

**Abertura das Propostas:** 18/03/2021 às 08:00h

**Data e Hora do Pregão:** 18/03/2021 às 09:00h

O Edital poderá ser obtido no site www.licitacoes-e.com.br

Goiânia, 1º de março de 2021.

Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 219806

**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**Procedimento Licitatório - Saneago nº 15.3-007/2020**

**Processo:** 3010/2018 - Saneago

Licitação realizada no dia 24/09/2020, às 14:30h

**Objeto:** CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

**DOS CENTROS DE RESERVAÇÃO: CURITIBA I, CURITIBA II, FINSOCIAL, SÃO DOMINGOS I E SÃO DOMINGOS II, NA CIDADE DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO.**

**Licitação Fracassada conforme Ata constante do processo.**

Goiânia, 24 de fevereiro de 2021.

Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 218894

**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**Pregão Eletrônico nº 035/2020**

**Processo:** 15229/2018 - Saneago

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COLETORES DE LODO COM REMOVEDOR DE ESCUMA - A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SECUNDÁRIO DA ETE HÉLIO SEIXO DE BRITTO DA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

**Empresa Vencedora:** ECOSAN TRATAMENTO EM SANEAMENTO EIRELI, CNPJ Nº 03.797.748/0001-55, lote único.

Goiânia, 24 de fevereiro de 2020.

Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 219213

**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

**Pregão Eletrônico nº 095/2020**

**Processo:** 12950/2020 - Saneago

**Objeto:** CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS DE BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSÍVEIS, MARCA EBARA, DESTINADO ÀS UNIDADES DA SANEAGO, NA CAPITAL E INTERIOR DESTE ESTADO.

**Empresa Vencedora:** TECNOBOMBAS BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 00.819.295/0001-22, lote único.

Goiânia, 02 de março de 2021.

Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 219804

## SANEAGO

### SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO

#### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Procedimento Licitatório nº 15.3-006/2020

Processo: 19693/2017 - SANEAGO

Licitação realizada no dia 03 (três) de novembro de 2020 às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos).

**Objeto:** CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AO REMANESCENTE DO BOOSTER ETAG, NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS.

**Licitação Deserta** por não comparecerem interessados ao certame, conforme Ata constante do processo.

Goiânia, 06 de novembro de 2020.

Ednilson Alves da Rocha

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 205053

## PODER LEGISLATIVO

### Assembleia Legislativa

#### AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2020

Republicação

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, através de sua Comissão de Licitação, torna público que realizará, no dia **19 de janeiro de 2021 às 09 horas, no Auditório Sólon Amaral** do Palácio Alfredo Nasser, situado na Alameda dos Buritis, nº 231, no Setor Oeste desta Capital, a **CONCORRÊNCIA nº 01 / 2020 (Processo nº 2020000486)**, do tipo **MELHOR TÉCNICA**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, A SEREM PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA**. O edital e seus anexos, bem como os demais documentos legalmente exigidos encontram-se disponíveis a todos os interessados nos sítios [al.go.leg.br](http://al.go.leg.br) e na **Sala 2008** (Sala da Comissão de Licitação) do Anexo Juarez Magalhães do Palácio Alfredo Nasser.

Informações também poderão ser obtidas pelo e-mail [licitacao@al.go.leg.br](mailto:licitacao@al.go.leg.br) e telefone: (62) 3221-3430.

Goiânia, 16 de novembro de 2020.

Luciula Santana dos Santos Ferreira

Presidente da CL - ALEGO

Protocolo 206031

## PODER JUDICIÁRIO

### Tribunal de Justiça

#### Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FUNDESP

#### AVISO DE LICITAÇÃO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação nas datas e horários abaixo indicados. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no sítio [www.tjgo.jus.br](http://www.tjgo.jus.br) e em [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). As informações poderão ser

obtidas junto a Secretaria da Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail [licitacao@tjgo.jus.br](mailto:licitacao@tjgo.jus.br) e [rjajme@tjgo.jus.br](mailto:rjajme@tjgo.jus.br).

PREGÃO ELETRÔNICO 076/2020 DO TIPO MENOR PREÇO  
Processo nº 201908000182963

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de motofrete visando a entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas, no Municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Recebimento das Propostas a partir das 08h00 do dia 27/11/2020

Abertura das Propostas a partir da 08h00 do dia 30/11/2020

Início da Disputa de Preços às 15h00 do dia 30/11/2020

Rogério Jayme

Pregoeiro

Protocolo 206043

#### AVISO DE LICITAÇÃO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação nas datas e horários abaixo indicados. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no sítio [www.tjgo.jus.br](http://www.tjgo.jus.br) e em [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). As informações poderão ser obtidas junto a Secretaria da Comissão Permanente de Licitação pelo e-mail [licitacao@tjgo.jus.br](mailto:licitacao@tjgo.jus.br) e [mamorim@tjgo.jus.br](mailto:mamorim@tjgo.jus.br).

PREGÃO ELETRÔNICO 071/2020 DO TIPO MENOR POR ITEM  
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP

Processo nº 20181000132214 e apensos

Objeto: Aquisição de lixeiras externas.

Recebimento das Propostas a partir das 08h00 do dia 27/11/2020

Abertura das Propostas a partir da 08h00 do dia 30/11/2020

Início da Disputa de Preços às 10h00 do dia 30/11/2020

Marcelo de Amorim

Pregoeiro

Protocolo 206044

## MINISTÉRIO PÚBLICO

### MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 135/2020

Menor Preço por Item

Objeto: Contratação de empresas especializadas para fornecimento de treinamentos à distância para utilização dos softwares Microsoft Project e Revit.

Abertura: 30/11/2020 às 13h30min.

Local: [www.comprasnet.go.gov.br](http://www.comprasnet.go.gov.br)

Informações: Fone: (62) 3243-8331; e-mail: [cpl@mpgo.mp.br](mailto:cpl@mpgo.mp.br); endereço eletrônico: <https://intranet.mpgo.mp.br/sgoc/portal/processos/editais>; ou Rua 23, Qd.A6, Lts. 15/24, Jardim Goiás, Goiânia-GO, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00 horas.

Goiânia, 13 de novembro de 2020.

Cinthia Tattielle de França Rodrigues Lemos

Pregoeira

Protocolo 206013

### MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 138/2020

Menor Preço Por Item

Sistema de Registro de Preços

Objeto: Aquisição de até 20 monitores de vídeo para computador com 28 polegadas com resolução 4k (3840 x 2160 pixels) ou superior.

Abertura: 02/12/2020 às 13h30min.

## FUNDAÇÕES

### Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG

#### AVISO DE CONVOCAÇÃO DE CADASTRO DE SUPLENTE - PROGRAMA CENTELHA

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG - torna pública a segunda convocação para contratação de cinco projetos selecionados em ordem classificatória, inscritos no cadastro de suplentes da Chamada Pública Nº 03/2019 - Programa Centelha. A lista de projetos suplentes convocados estará disponível no sítio da FAPEG (fapeg.go.gov.br) e na plataforma do Programa Centelha a partir do dia 01/12/2020. Processo nº 201810267001572. Gabinete do Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Presidente Robson Domingos Vieira. Goiânia aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Protocolo 208104

#### EXTRATO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A FAPEG E A UFG

Termo de Apostilamento ao Convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e acadêmica entre as partes acima identificadas, para implementação de bolsas de desenvolvimento tecnológico e industrial, modalidades DTI-B e DTI-C, vinculadas ao projeto: o impacto social, cultural e econômico das pesquisas fomentadas pela FAPEG na sociedade goiana: memórias, perfis e propostas para a popularização da ciência, da tecnologia e da inovação. Processo SEI: 201810267000876. Partícipes. Concedente: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG, CNPJ 08.156.102/0001-02; Conveniente: Universidade Federal de Goiás - UFG, CNPJ 01.567.601/0001-43. Do Objeto: a prorrogação de ofício da vigência do convênio até dia 10 de dezembro de 2021. Da Ratificação: Ratificam-se as demais Cláusulas e Condições do Convênio, não especificamente alteradas pelo Instrumento, que aquele se integra para um só efeito. Data de assinatura: 26/11/2020. Signatários: Pelo Concedente: Robson Domingos Vieira - Presidente, CPF 893.403.291-04. Pelo Conveniente: Edward Madureira Brasil - Reitor, CPF 288.468.771-87.

Protocolo 207933

## PARAESTATAIS - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

### Agência de Fomento de Goiás S/A – GOIASFOMENTO

#### AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Pregão Eletrônico nº 006/2020

O Pregoeiro da Agência de Fomento de Goiás S/A - GOIASFOMENTO, designado pela Portaria nº 023/2020, torna público o Pregão Eletrônico nº 006/2020, Tipo: Menor Preço Global/ Por Hora Trabalhada, Processo nº 202000059001264, que será realizado no dia 28 de dezembro de 2020, às 08:30 hrs, tendo por objeto: Contratação por um período de 12 (doze) meses de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split, central de ar condicionado tipo Carrier 22,5 TRS, com fornecimento de mão de obra para manutenção geral, correção nas redes de energia elétrica, malha luminária e tomadas, rede lógica e telefônica, rede hidro sanitária, a serem prestados em 02 (dois) prédios da Agência de Fomento de Goiás S/A, conforme serviços relacionados no Termo de Referência (Anexo-I) do Edital. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da GOIASFOMENTO, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás em 10/11/2020 e demais normas vigentes aplicáveis à matéria. Obtenção do edital e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos no site: <http://www.goiasfomento.com/procedimentosAdministrativos/licitacoes-contratos.html>. Informações: Avenida Goiás nº 91 - Centro - Goiânia

- Goiás - CEP: 74.005-010 - Fone: (62) 3216-4979 - Fax: (62) 3216-4970. Agência de Fomento de Goiás S/A - GOIASFOMENTO, aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA

Pregoeiro

Protocolo 208080

### Metrobus Transporte Coletivo S/A

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S.A., torna público a ratificação da dispensa de licitação nº 059/20 para contratação da empresa Valadão e Venância Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 37.412.699/0001-07, no valor de R\$ 3.000,00, nos termos do Art. 142, II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos de Metrobus e Art. 33 e 34 da Lei Estadual nº 17.928/12, conforme processo 202000417, visando o fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP.

Miguel Elias Hanna  
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO

Protocolo 208083

### SANEAGO

#### SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

#### Procedimento Licitatório - Saneago nº 15.3-017/2020

Processo: 15715/2019 - Saneago

Licitação realizada no dia 26/11/2020, às 14h30min.

Objeto: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO BOOSTER JOÃO LEITE E DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA JOÃO LEITE - VILA CRISTINA (CONEXÃO CRISTINA), NA CIDADE DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO.

Licitação Fracassada conforme Ata constante do processo.

Goiânia, 27 de novembro de 2020.

Ednilson Alves da Rocha

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 207996

## TRIBUNAIS DE CONTAS

### Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE

#### EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO o Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação (doc. 16 e-TCE), consoante com o art. 26, da Lei nº 8.666/1993 e o inciso X, do art. 33, da Lei Estadual nº 17.928/2012, em conformidade com os documentos que instruem o processo nº 202000047001985, em favor de *Render Cursos Ltda*, inscrita no CNPJ sob o nº 13.359.691/0001-66, cujo objeto é aquisição de 500 (quinhentas) licenças de cursos EaD de capacitação vários, atinentes às atividades do TCE-GO, via sistema web, válidas por 18 (dezoito) meses, perfazendo o valor total de R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 25, II, c/c o art. 13, VI, da Lei Federal nº 8.666/93.

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 30 de novembro de 2020.

Conselheiro Celmar Rech  
Presidente

Protocolo 207959

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico nº 016/2021

Processo: 12945/2019 - Saneago

Modo de Disputa: ABERTO

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO

Licitação contemplando LOTE(S) destinado(s) à AMPLA PARTICIPAÇÃO, para aquisição de material(is) e/ ou equipamento(s), será realizada no sistema "Licitações-e" do Banco do Brasil S.A. no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A., conforme disposições fixadas no Edital e Anexos.

**Recursos:** Próprios da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago.

**Limite de Acolhimento de Propostas:** 19/04/2021 às 08:00h

**Abertura das Propostas:** 19/04/2021 às 08:00h

**Data e Hora do Pregão:** 19/04/2021 às 09:00h

O Edital poderá ser obtido no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br)

Goiânia, 26 de março de 2021.

Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 224174

**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA**

Procedimento Licitatório nº 15.3-026/2020 - Saneago

Processo: 7135/2020 - Saneago

Licitação realizada no dia 26/03/2021, às 14h30min.

**Objeto:** CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO VILA CRISTINA, COM IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE 10.000 M² E INTERLIGAÇÕES, NA CIDADE DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO.

**Licitação Fracassada** conforme Ata constante do processo.

Goiânia, 29 de março de 2021.

Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 224176

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
**ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº**  
**6.2- 6/2021**

**PROCESSO Nº 12505/2020**

A SANEAMENTO DE GOIÁS S.A., através da Diretoria de Gestão Corporativa e da Diretoria da Presidência, torna público que, com base nos termos do artigo 30, inciso I, da Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, e, artigo 52, inciso I e artigo 55 do Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago (RPC), publicado no DOE-GO em 22/11/2017 e DOU em 20/12/2017, DECLARA inexigível a licitação para contratação direta da empresa: IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.372.251/0001-56, visando a Contratação do Serviços de Subscrição de Software, Telesuporte e Manutenção Corretiva de Hardware, marca IBM, com prazos de execução e vigência contratual de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, no valor total de R\$ 188.552,33 (Cento e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos), tudo de acordo com Parecer Jurídico nº 012/2021, págs. 232 à 259, bem como Nota Jurídica nº 59/2021, págs. 273 à 279, ambos da JSLC, e demais documentos, constantes do Processo nº 12505/2020.

Goiânia, 26 de março de 2021.

Silvana Canuto Medeiros -  
Diretora  
DICOR - Diretoria de Gestão  
Corporativa

Ricardo José Soavinski -  
Diretor  
DIPRE - Presidência

Protocolo 224195

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
**AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico nº 092/2020

Processo: 6486/2020 - Saneago

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS DE USO LABORATORIAL, DESTINADOS A ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

A Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, torna público a **REVOGAÇÃO** do Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico nº 092/2020, publicado no Diário Oficial/GO nº 23.499, de 26/02/2021, que encontrava-se adiado "sine die", nos termos da Decisão nº 6/2021 da DIPRE - Presidência e DICOR - Diretoria de Gestão Corporativa, constante dos autos do processo

Goiânia, 26 de março de 2021.

Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 224173

## TRIBUNAIS DE CONTAS

### Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE

PORTARIA Nº 112/2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**

EXONERAR o servidor **TIAGO DUCATTI DE OLIVEIRA E SILVA** do cargo comissionado de Assessor IV - AS TCE IV, com efeitos a partir de 1º de março de 2021.

**CUMPRE-SE e PUBLIQUE-SE.**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**, em Goiânia, 03 de março de 2021.

*Conselheiro Edson Jose Ferrari*  
Presidente

Protocolo 224015

## PODER LEGISLATIVO

### Assembleia Legislativa

#### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

##### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 10/2021 - SRP

Data da sessão: 14/04/2021 às 09:00h

**Objeto:** Registro de preços destinado a aquisição de papéis especiais, materiais gráficos e serviço de impressão de livros, para atender às demandas da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. (Os itens 01 ao 08, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24 ao 32 são destinados exclusivamente a participação de ME e EPP).

O respectivo edital encontra-se disponível a todos os interessados nos sites [comprasnet.go.gov.br](http://comprasnet.go.gov.br) e [transparencia.al.go.leg.br/licitacoes/editais](http://transparencia.al.go.leg.br/licitacoes/editais). Informações poderão ser obtidas também pelo e-mail [licitacao@al.go.leg.br](mailto:licitacao@al.go.leg.br) e telefone: (62) 3221-3155.

Goiânia, 30 de março de 2021.

**Luciula Santana dos Santos Ferreira Bernini**  
Presidente da CL - ALEGO

Protocolo 224139



Goiânia, 21 de julho de 2021.  
Victor Leandro Arantes Chaves  
Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 244502

**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA**

**Procedimento Licitatório nº 15.3-004/2021 - Saneago**

**Processo: 2154/2021 - Saneago**

Licitação realizada no dia 20/07/2021, às 14:30h.

**Objeto: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À ENERGIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO HÉLIO SEIXO DE BRITTO EM 13,8 KV, NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS.**

**Licitação Deserta** por não comparecerem interessados ao certame, conforme Ata constante do processo.

Goiânia, 21 de julho de 2021.  
Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 244483

## TRIBUNAIS DE CONTAS

### Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE

#### RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**RATIFICO** o Ato de Declaração de Inexigibilidade de Licitação (doc. 17 e-TCE), e autorizo consoante o parágrafo único do art. 72, da Lei nº 14.133/2021 e o inciso X, do art. 33, da Lei Estadual nº 17.928/2012, em conformidade com os documentos que instruem o processo nº 202100047001495, a contratação da empresa Lacuna Software Ltda-EPP, inscrita no CNPJ nº 20.658.903/0001-71, cujo objeto é a aquisição de licenciamento Lacuna PKI Suite - Perpétua e suporte técnico, que mantém a operacionalização de Certificação Digital padrão ICP-Brasil utilizada nos sistemas informatizados desta Corte de Contas, perfazendo o custo total de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com fundamento no art. 74, inciso I, da Lei 14.133/2021. Declaro que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de julho de 2021.

**Conselheiro Edson José Ferrari**  
Presidente

Protocolo 244452

## MUNICÍPIOS

## PREFEITURAS

### Águas Lindas de Goiás

#### EDITAL DECONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021

A Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, no dia 8 de setembro de 2021, às 9h, concorrência pública 001/2021, tipo técnica e preço, tendo por objeto a **Contratação de 01 (uma) agência de publicidade e propaganda para a prestação de serviços de publicidade e divulgação dos programas, ações e campanhas institucionais do Município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.** O edital poderá ser acessado em [www.aguaslindasdegoias.go.gov.br](http://www.aguaslindasdegoias.go.gov.br). Informações pelo fone 61-98425-9272. Águas Lindas de Goiás, 21 de jul. 2021. Eliseu B. Galvão, presidente da CPL.

Protocolo 244531

### Alexânia

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2021 Conforme Ato Convocatório disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Alexânia/GO. Convocamos os (as) senhores (as): João Paulo de Macedo Rodrigues, Cicero Romão da Silva Ficaves, Marise Candido da Silva Costa, Ananda Oliveira Braz Ribeiro, Naiani Aparecida da Silva, Maria Luzia da Costa Freire, para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação de Alexânia/GO situada na Av. Nelson Santos - Área Especial, S/N, Setor Central - Alexânia/GO, nos dias, horários e condições especificados na Convocação publicada no site oficial: <http://www.alexania.go.gov.br/transparencia1/publicacoes/editais>. ANA LÚCIA DE HOLANDA SOUSA Secretária Municipal de Educação

Protocolo 244535

### Alto Horizonte

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE

O Município de Alto Horizonte torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Licença Ambiental para Instalação de uma Jazida de Cascalho para atender as obras de implantação do Anel Viário que intersectam as GO's 347 e 556, parte da área do imóvel denominado M: 0466 CRI- AH. No Município de Alto Horizonte. O Empreendimento não se enquadra na resolução C O N AM A 001/86, que dispõe sobre o impacto Ambiental. Prefeito Luiz Borges da Cruz.

Protocolo 244464

#### MUNICÍPIO DE ALTO HORIZONTE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Alto Horizonte - GO AVISA que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, será realizado e processado de acordo com a Lei n.º 10.520/02, a Lei n.º 8.666/93 conforme o disposto a seguir: I- MODALIDADE/EDITAL: Pregão Presencial nº 46/2021 II- TIPO: menor preço por item III- PROCESSO Nº 22006481/2021 IV- OBJETO: Registro de preço para aquisição de material específico para drenagem pluvial e rede de esgotamento público municipal, para atender as necessidades da Administração Pública, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Alto Horizonte - GO, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital V- DATA AUDIÊNCIA: 03/08/2021 às 08:00 horas VI- INFORMAÇÕES/EDITAL: [www.altohorizonte.go.gov.br/licitacao@altohorizonte.go.gov.br](http://www.altohorizonte.go.gov.br/licitacao@altohorizonte.go.gov.br) Fone: 3383/3100. Alto Horizonte, 22 de Julho de 2021. Ana Maria Fernandes da Silva - Pregoeira

Protocolo 244465

### Americano do Brasil

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 a prefeitura municipal de Americano Do Brasil-GO torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 03 de agosto de 2021 às 09:00 h, na prefeitura municipal, na rua Três Poderes, s/n centro. Americano Do Brasil-GO, inscrito no CNPJ sob o nº. 00.007.344/0001-22, em sessão pública, na forma da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e suas alterações, licitação na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, regulado pelo edital e seus anexos. A presente licitação tem como contratação de empresa para fornecimento de: toners, cilindros fotocondutores e refil de recarga, para a manutenção das secretarias e fundos do município de Americano Do Brasil-GO, nos termos do anexo I do edital, que poderá ser retirado pelo site: <https://www.americanodobrasil.go.gov.br/>, maiores informações pelo fone 64 3504-1213, das 07:00 às 11:00 hs das 13:00 às 17:00hs. Americano do Brasil, 19 de julho de 2021 Raniery Carvalho dos Santos Pregoeiro/Decreto Nº 168/2021.

Protocolo 244532



## PARAESTATAIS - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

### Agência Goiana de Habitação – AGEHAB

**COMUNICADO Nº 013/2021**  
**EDITAL Nº 002/2021 - AGEHAB**  
**EMPREENDIMENTO DONA MULATA - PARAÚNA-GO**  
Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB, torna público aos interessados a **DECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS** listados abaixo. Estes foram convocados para apresentarem defesa a possível desclassificação, no prazo de 5 (dias) úteis. Este prazo expirou-se sem a apresentação de documentação. Estes interessados não enquadraram nos critérios do Programa, conforme regras definidas no **Edital nº 002/2021 - AGEHAB - Regulamento de Inscrição para Seleção de Famílias do Programa Construção com recurso do Fundo PROTEGE GOIÁS - Empreendimento Dona Mulata no município de Paraúna-GO**, publicado no SUPLEMENTO DO D.O.E. nº 23.579 do dia 25 de junho de 2021.

SEQ	TITULAR	CPF	CAD. RESERVA	GRUPO
1	NÁDIA CRISTINA AMADOR LIMA ASSUNÇÃO	XXX.975.1XX-XX	Sim	GRUPO I

Sendo assim, convocamos, conforme as regras do **Edital nº 002/2021 - AGEHAB**, os **SORTEADOS NO CADASTRO DE RESERVA**, de acordo com a ordem do sorteio. Os seguintes nomes listados no site da AGEHAB ([www.agehab.go.gov.br](http://www.agehab.go.gov.br)) abaixo relacionados, deverão comparecerem na sede da CRAS, localizada à Av. Raul Ferro, Paraúna-GO, no dia e horário agendado, para entrega de sua documentação. A Prefeitura de Paraúna entrará em contato para agendamento para entrega de documentação.

TITULAR - NOME	TITULAR - CPF	CÔNJUGE - NOME	CÔNJUGE - CPF	GRUPO
MARIA EDUARDA FELIX DA SILVA	XXX.116.3XX-XX	-	-	GRUPO I

Goiânia, 23 de setembro de 2021.  
Agência Goiana de Habitação - AGEHAB

Protocolo 256523

### Metrobus Transporte Coletivo S/A

PROCESSO: 202100112 1º Aditivo ao Contrato nº 048/21  
OBJETO: Fornecimento de álcool líquido 70%.  
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A  
CONTRATADA: Comercial Monteiro Eirelli  
VALOR DO ADITIVO: R\$ 1.208,40 VIGÊNCIA: 11/03/22  
ASSINATURA: 14/09/21 TIPO: Dispensa de Licitação nº 033/21  
SIGNATÁRIOS: Francisco Caldas, Miguel Elias Hanna - Metrobus e Habacqueberg Vale Lima - Comercial Monteiro

Protocolo 256564

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 090/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte individual de passageiros, conforme processo nº 202100258, foi declarado Deserto.

Francisco Caldas  
Diretor-Presidente

Protocolo 256551

### SANEAGO

#### Edital de Comunicação

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, torna público que **requereu** da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a seguinte licença ambiental:

- **Licença de Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário Mesquita do município de Cidade Ocidental-GO.**

O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86 que dispõe sobre o impacto ambiental.

Protocolo 256412

#### Edital de Comunicação

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, torna público que **requereu** da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a seguinte licença ambiental:

- **Licença de Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário Saia Velha do município de Cidade Ocidental-GO.**

O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86 que dispõe sobre o impacto ambiental.

Protocolo 256414

#### Edital de Comunicação

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, torna público que **requereu** da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a seguinte licença ambiental:

- **Licença de Instalação para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Rio Vermelho do município de Luziânia-GO.**

O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86 que dispõe sobre o impacto ambiental.

Protocolo 256415

#### Edital de Comunicação

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, torna público que **requereu** da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a seguinte licença ambiental:

- **Licença de Instalação para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Lago Azul do município de Novo Gama-GO.**

O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86 que dispõe sobre o impacto ambiental.

Protocolo 256416

#### **SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO**

#### **AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA**

#### **Procedimento Licitatório - Saneago nº 15.3-026/2020**

**Processo: 7135/2020 - Saneago**

Licitação realizada no dia 09/09/2021, às 14:30h.

**Objeto: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO VILA CRISTINA, COM IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE 10.000 M³ E INTERLIGAÇÕES, NA CIDADE DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO.**

**Licitação Fracassada conforme Ata constante do processo.**

Goiânia, 21 de setembro de 2021.

Victor Leandro Arantes Chaves

Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 256483

## CELG Geração e Transmissão

CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG GT  
EXTRATO DE CONTRATO - Art. 148, RILC da CELG PAR e Art. 61, P.U., LEI 8.666/93  
.PR-PRGE 080/2021 (Processo nº 03006-2021). SEI 202110269000054. Objeto: fornecimento de 300 (trezentas) extensões de garantia de atualização do software antivírus corporativo kaspersky. Contratada: UNITEC SOLUÇÕES EM TI LTDA. CNPJ: 23.927.844/0001-88. Vigência: 36 (trinta e seis) meses contados da data da assinatura do contrato. Valor: R\$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil reais). Execução: 10 (dez) dias corridos.  
.PR-PRGE 079/2021 (Processo nº 03006-2021). SEI: 202110269000054. Objeto: fornecimento de 12 (doze) licenças de software Autodesk AutoCAD LT 2D para desktops e notebooks da Celg GT. Contratada: LAURO RENATO ROCHA. CNPJ: 03.716.680/0001-32. Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados da data da assinatura. Valor: 59.000,00 (cinqüenta e nove mil reais). Execução: 10 (dez) dias corridos.  
.VP-DPSE 063/2021 (Processo nº 20.500636-X). SEI: 202110269000035. Objeto: aquisição de ferramentas gerais de uso individual e coletivo. Contratada: GOLDEN TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 24.702.397/0001-21. Vigência 36 (trinta e seis) meses a contar da data de assinatura do contrato. Valor: 28.028,24 (vinte e oito mil, vinte e oito reais e vinte e quatro centavos.). Execução: 30 (trinta) dias corridos da assinatura de cada contrato.  
.PR-PRGE 086/2021 (Processo nº 18.501710-01). SEI 201810269000070. Objeto: obras civis e eletromecânicas na SE Carajás. Contratada: CCV ENERGIA & CONSTRUÇÕES EIRELI. CNPJ 37.324.241/0001-04. Vigência 90 (noventa) dias a contar do término previsto no terceiro termo aditivo ao contrato PR-PRGE 041/2019, findando no dia 29/12/2021.

Protocolo 260398

## CELGPAR

COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES - CELGPAR  
CNPJ Nº 08.560.444/0001-93  
NIRE 52300010926  
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO  
REGISTRO CVM 2139-3  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas da Companhia Celg de Participações - CELGPAR ("Celgpar"), objetivando o comparecimento à Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, ressalvadas as disposições presentes na Lei nº 13.303, de 30.06.2016, normas da Comissão de Valores Mobiliários, e do Estatuto Social, de 28.10.2020.

A Assembleia será realizada na Rua 2, Quadra A-37, nº 505, Edifício Gileno Godói, 1º Andar, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-180, em Goiânia - Goiás, endereço de unidade administrativa da Celgpar, decorrente de disposição do Art. 124, § 2º (segunda parte), da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 às 10 (dez) horas, do dia 3 (três) de novembro de 2021, para deliberar sobre as seguintes matérias:

1. Reforma Estatutária resultante da criação de Diretoria na estrutura da Celgpar, observadas intervenções no Art. 34, Art. 45, Art. 50, Art. 55, Art. 56, e Art. 77, precedida de renumeração do Art. 56 ao Art. 98 para Art. 57 ao Art. 99, respectivamente, vinculados aos capítulos "Órgãos Estatutários e Respektivas Normas Gerais", "Diretoria", "Conselho Fiscal", "Comitê de Auditoria Estatutário", "Comitê de Elegibilidade", "Governança Corporativa e Transparência", "Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Reservas, Participação nos Lucros e Dividendos", "Disposições Gerais", e "Disposições Transitórias";
2. Incumbir à Diretoria da Celgpar a implementação de todas as medidas deliberadas; e
3. Autorização de execução de atos relativos à publicação da ata da Assembleia e das respectivas deliberações e, também, da reforma estatutária.

## INSTRUÇÕES GERAIS

- a) os acionistas ou os respectivos representantes legais, objetivando assegurar a admissão na Assembleia (Art. 5º, caput, Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009; e Art. 13, § 2º, do Estatuto Social), deverão apresentar os seguintes documentos:
- documento oficial de identidade com foto;
  - fotocópia autenticada em Cartório do Estatuto Social ou do Contrato Social atualizado, no caso de acionista pessoa jurídica;
  - original ou fotocópia autenticada em Cartório de procuração outorgada pelo acionista; e
  - via original do extrato de posição acionária, fornecido pela instituição depositária ou pela custódia, com data não anterior a 2 (dois) dias úteis.
- b) os instrumentos de mandatos com poderes especiais para representação na Assembleia deverão ser depositados na área de supervisão do Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis anteriores à realização da Assembleia (Art. 13, § 2º, Estatuto Social);
- c) os acionistas da Celgpar poderão obter cópia do "Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária" e da "Proposta da Administração Para a 60ª Assembleia Geral Extraordinária", na área de supervisão do Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores e, ainda, nos seguintes portais:
- <http://ricelgpar.celggt.com/> (sítio da Celgpar);
  - <http://www.cvm.gov.br/> (portal da Comissão de Valores Mobiliários); e
  - [http://www.b3.com.br/pt\\_br/](http://www.b3.com.br/pt_br/) (sítio da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão).
- d) ainda, ratifica-se que a área de supervisão do Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores está localizada na Avenida C, Quadra A-36, Lote 01, nº 60, Bairro Jardim Goiás, CEP 74805-070, Goiânia - Goiás, também, contatável pelos telefones (62) 36123938 / 36123939 / 36123951.

Goiânia, 13 de outubro de 2021.

Savio de Faria Caram Zuquim  
Conselho de Administração

Protocolo 260100

## Metrobus Transporte Coletivo S/A

PROCESSO: 202100145 Contrato nº 140/21  
OBJETO: Fornecimento de equipamentos pneumáticos.  
CONTRATANTE: Metrobus Transporte Coletivo S/A  
CONTRATADA: Gomafe Goiás Máquinas e Ferramentas Ltda..  
VALOR: R\$ 4.350,00 VIGENCIA: 12 (doze) meses  
ASSINATURA: 05/10/21 TIPO: Dispensa de licitação nº 060/21  
SIGNATÁRIOS: Francisco Caldas, Miguel Elias Hanna- Metrobus e Nelson Arantes Vitorino - Gomafe Goiás

Protocolo 260743

## SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO  
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA  
Procedimento Licitatório - Saneago nº 15.3-017/2020  
Processo: 15715/2019 - Saneago  
Licitação realizada no dia 06/10/2021, às 14:30h.  
Objeto: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DO BOOSTER JOÃO LEITE E DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA JOÃO LEITE - VILA CRISTINA (CONEXÃO CRISTINA), NA CIDADE DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO.  
Licitação Fracassada conforme Ata constante do processo.  
Goiânia, 14 de outubro de 2021.  
Victor Leandro Arantes Chaves  
Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 260920


**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DO  
ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS****DATA: 31 DE MARÇO DE 2022****HORÁRIO: 14h30min****PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 15.3-026/2020 – SANEAGO****PROCESSO: 7135/2020****OBJETO: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO VILA CRISTINA, COM IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE 10.000 M³ E INTERLIGAÇÕES, NA CIDADE DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO.**

Às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) do dia 31 (trinta e um) de março de 2022, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, composta pelos seus membros Roberto Braga, Lucas Vieira Ribeiro e Lorrany Souza Lima, sob a presidência do primeiro, a fim de proceder ao recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços ofertados ao Edital em referência. Aberta a sessão pelo Sr. Presidente da Comissão, verificou-se a presença das seguintes licitantes: 01) SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA, representada por LUCIANO ALVES DE SOUZA. Conferiu-se o documento necessário para o credenciamento apresentado pelo representante legal da empresa participante, que correspondeu com o original. A proponente SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA não apresentou a Declaração de Enquadramento como Beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. Franqueada a palavra aos presentes, não houve manifestação acerca da fase de Credenciamento. Prosseguindo a sessão, foi entregue o Envelope Sigiloso 1 – Proposta de Preços, que se encontrava devidamente fechado. Procedeu-se, então, à abertura do envelope do licitante, cujo preço foi lido em voz alta e a proposta nele contida verificada e rubricada pelos membros da Comissão, cujo valor apresentado foi o seguinte:


EMPRESA LICITANTE	PREÇO GLOBAL
SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 10.539.524,80

A única proposta de preços foi apresentada pela empresa SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA, com valor global de R\$ 10.539.524,80 (dez milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), que se encontra com valor superior ao estimado pela Saneago para a contratação, de R\$ 7.327.702,67 (sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, setecentos e dois reais e sessenta e


sete centavos), conforme item 4.2 do Edital. Após a constatação de que a proposta de preço apresentada pela empresa SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA encontrava-se em valor superior ao estimado, atendendo ao disposto no art. 139, do Regulamento dos Procedimentos de Contratação da Saneago – RPC, foi realizada tentativa de negociação de preço, oportunidade em que o representante credenciado manifestou-se pela ausência de interesse na redução do valor proposto, razão pela qual a Comissão Permanente de Licitações declarou a presente **LICITAÇÃO FRACASSADA**. O representante credenciado requereu que constasse na carta proposta de preços: onde se lê “Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos”, leia-se “Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos”. Franqueada a palavra aos presentes, nada mais foi requerido. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às 14h52min (quatorze horas e cinquenta e dois minutos), lavrando-se esta ata que, lida e achada conforme, será assinada pelo Presidente e membros da Comissão e licitante presente.



**Lucas Vieira Ribeiro**  
Membro da Comissão  
Permanente de Licitações



**Lorrany Souza Lima**  
Membro da Comissão  
Permanente de Licitações



**Roberto Braga**  
Presidente da Comissão  
Permanente de Licitações

REPRESENTANTE:



SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA

**ANEXO II – Aviso de Licitação - Publicação em Diário Oficial.**

202100031000807	202103000052	Município de São Luiz Montes Belos	02.320.406/0001-87	22/02/2022	Retificação do item B e C do Quadro Resumo e a Cláusula Primeira - Do Objeto, Clausula Terceira-Do Programa, Quarta -Das Obrigações dos Partícipes, Sexta -Da Responsabilidade Técnica e Tecima Terceira - Das Penalidades
-----------------	--------------	------------------------------------	--------------------	------------	--

Goiânia, em 22 de Fevereiro 2022.  
Pedro Henrique Ramos Sales  
Presidente da AGEHAB

Protocolo 286016

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - AGEHAB**  
**PROCESSO Nº 202100031001629**

AAGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 050/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão (Eletrônico), tipo **MENOR PREÇO - POR ITEM**, em sessão pública eletrônica, a partir das 9:00 horas do dia 14 de março de 2022, através do site [www.comprasnet.go.gov.br](http://www.comprasnet.go.gov.br), destinado à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA AGEHAB, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, CONFORME CONDIÇÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS**, relativo ao Processo nº 202100031001629, nos termos da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás em 14/09/2018, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº 117/2015, Decreto Estadual nº 9.666/2020, Decreto Estadual nº 7.466/2011, Lei 8.666/93, de forma subsidiária e pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20, Conjunto Caiçara (BR-153, Km 3,5) CEP 74.755-013, Goiânia - Go, Fone: (62) 3265-4190 ou nos sites [www.comprasnet.go.gov.br](http://www.comprasnet.go.gov.br) e [www.agehab.go.gov.br](http://www.agehab.go.gov.br).

A execução dos serviços objeto deste Edital será custeada à conta dos **RECURSOS PRÓPRIOS/SUBVENÇÃO ECONÔMICA CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ATUAL DO ESTADO DE GOIÁS**.

Goiânia, 22 de fevereiro de 2022.

AQUILINO ALVES DE MACEDO  
PREGOEIRO

Protocolo 286033

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022**  
**PROCESSO Nº 202100031001178**

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A - AGEHAB, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação **Pregão Eletrônico nº 001/2022** foi adiada em virtude de **ALTERAÇÃO NO EDITAL**. Desta forma, a abertura da licitação prevista para o dia **23 de fevereiro de 2022 às 09 horas** fica adiada para o dia **11 de março de 2022 às 09:00 horas**. O nove edital com as devidas alterações será postado nos sítios [www.agehab.go.gov.br](http://www.agehab.go.gov.br) e [www.comprasnet.go.gov.br](http://www.comprasnet.go.gov.br).

Goiânia, 22 de fevereiro de 2022.

AQUILINO ALVES DE MACEDO  
PREGOEIRO

Protocolo 285930

**Companhia De Desenvolvimento Econômico De Goiás - CODEGO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO.

Contratada: MG STECKELBERG - STECKELBERG INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - CNPJ Nº 14.460.411/0001-74

Processo SEI nº 202110216002161

Modalidade de Licitação - Dispensa em razão do valor nº068/2021-CONTRATO Nº 006/2022 - Valor: R\$ 4.189,50 - Fonte de Recursos: Próprios - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peça sob medida e prestação de serviço para montagem de redutor de "extintor de cal" no DAIA, conforme condições quantidades e exigência no Termo de Referência. Vigência: 90 dias a contar da assinatura e até 10 dias após o recebimento da Ordem de Serviço - Data da assinatura: 17/02/2022. Forma de Pagamento: No prazo de até 30 (trinta) dias, após a data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

Protocolo 285845

**SANEAGO**

**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - SANEAGO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO**

Licitação nº 15.3-006/2020 - Saneago

Processo: 19693/2017

Forma: Presencial

Destinação: Ampla Participação

Modo de Disputa: Fechado

Regime de Execução: Contratação Semi-Integrada

Critério de Julgamento: Menor Preço

Objeto: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REMANESCENTES RELATIVOS À EXECUÇÃO DO BOOSTER ETAG, NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO, conforme disposições fixadas no Edital e Anexos. Recursos: OGU/PAC, Termo de Compromisso nº 0350.788-10/2011. A sessão pública será realizada no auditório da Superintendência de Licitações e Aquisições, na sede da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago, à Av. Fued José Sebba nº 1245, Setor Jardim Goiás - Goiânia-GO.

Data de Abertura: 10/05/2022, às 14:30h

O Edital e Anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: [www.saneago.com.br](http://www.saneago.com.br)

Goiânia, 21 de fevereiro de 2022.

Victor Leandro Arantes Chaves  
Superintendência de Licitações e Aquisições

Protocolo 285790

**ANEXO III – Relação de Investimentos Realizados referente  
a Obras Previstas no PGP de Goiânia.**

**RELAÇÃO DE OBRAS E INVESTIMENTOS REALIZADOS - PGP GOIÂNIA**

SISTEMA	CÓDIGO	OBJETO	SITUAÇÃO ATUAL	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATO (CT)	VALOR ATUALIZADO	INVESTIMENTOS REALIZADOS (R\$)				TOTAL
						ATÉ 2019	2020	2021	2022 (até Mar/22)	
ÁGUA	A - 01/15	Booster Cascalho - Vazão: 1.000 l/s.	CONCLUÍDA	CT 30000133/2019	R\$ 7.148.481,80	R\$ 76.587,27	R\$ 5.428.540,73	R\$ 1.643.353,80	-	R\$ 7.148.481,80
ÁGUA	A - 02/15	Booster ETAG (Lote 1A) - Vazão: 4.800 l/s.	PUBLICADA	PROC. 19693/2017	R\$ 13.978.666,98	-	-	-	-	R\$ -
ÁGUA	A - 03a/15	AAE ETAG/SENAC (Lote 1B) - Extensão: 2,946 m. - Diâmetro: 1,626mm - Aço.	EM EXECUÇÃO	CT 30000241/2021	R\$ 15.045.550,13	-	-	R\$ 59.157,79	R\$ 603.944,79	R\$ 663.102,58
ÁGUA	A - 03b/15	Linhão GYN-APA - Lote 1 • EAT SENAC: - Vazão: de 1.500 l/s para 3.000 l/s). • AAT SENAC/CELG: - Extensão: 1,668 m. - Diâmetro: 1,200mm - Aço.	EM EXECUÇÃO	CT 30000383/2021	R\$ 48.020.344,16	-	-	-	R\$ 405.843,88	R\$ 405.843,88
ÁGUA	A - 06/15	CRs Curitiba 1 e 2 (Lote 4)	CONCLUÍDA	CT 30000310/2020	R\$ 5.028.384,29	-	-	R\$ 5.028.384,29	-	R\$ 5.028.384,29
ÁGUA	A - 12/15	Rede de Abastecimento João Paulo II – Obra Direta	CONCLUÍDA	OBRA DIRETA	R\$ 472.309,67	-	R\$ 472.309,67	-	-	R\$ 472.309,67
ÁGUA	A - 13/15	Estudo Hidrológico da Região Metropolitana	CONCLUÍDA	CT 1163/2018	R\$ 1.757.712,77	R\$ 137.421,31	R\$ 377.503,41	-	R\$ 321.706,40	R\$ 836.631,12
ESGOTO	E - 01a/12	ETE HSB - Implantação do tratamento secundário (Obras civis)	EM EXECUÇÃO	CT 317/2016	R\$ 59.733.643,93	R\$ 7.605.458,26	R\$ 29.654.294,38	R\$ 15.676.978,22	R\$ 1.819.003,78	R\$ 54.755.734,64
ESGOTO	E - 01b/12	Energização/Subestação da ETE HSB em 13,8 kV (Obras civis)	INSTURÇÃO LICITATÓRIA	PROC. 13835/2021	R\$ 5.094.915,83	-	-	-	-	R\$ -
ESGOTO	E - 04/12	Rede Coletora de Esgoto - Região Noroeste (Jardim Nova Esperança, Jardim Petrópolis e adjacências)	CONCLUÍDA	CT 30000256/2019	R\$ 16.099.250,88	R\$ 112.797,52	R\$ 11.265.625,66	R\$ 4.720.827,70	-	R\$ 16.099.250,88
ESGOTO	E - 05a/12	RCE Noroeste - Bacias Caveirinha e MP Norte (Sub-Bacias CV02 a CV08, CV11, CV13, CV17, CV19, MP14, MP20, MP22, MP24, MP26 e MP28). - Extensão: 147 mil metros (funcionalidade imediata)	EM EXECUÇÃO	CT 30000287/2021	R\$ 27.499.706,01	-	-	R\$ 927.794,58	R\$ 5.563.285,12	R\$ 6.491.079,70
ESGOTO	E - 07a/12	Intermediário Meia Ponte Jusante - 05 ETEEs - Interceptores	INSTRUÇÃO LICITATÓRIA	PROC. 17573/2021 (obras executadas parcialmente no CT 1716/2015)	R\$ 24.781.727,10	R\$ 4.559.098,35	R\$ 2.651.782,52	R\$ 2.769.148,98	-	R\$ 9.980.029,85
ESGOTO	E - 07b/12	Ampliação ETE Pq. Atheneu (600 l/s) - Ampliação e melhoria do tratamento preliminar e da lagoa de decantação. - Implantação sistema de aeração.	INSTRUÇÃO LICITATÓRIA	PROC. 12103/2021 (obras executadas parcialmente no CT 1717/2015)	R\$ 13.112.837,08	R\$ 4.366.373,22	R\$ 215.383,32	R\$ 124.533,25	-	R\$ 4.706.289,79
ESGOTO	E - 12a/12	Sistema Taquaral – Lote 1- Bacia Taquaral – Fase 1 - Redes Coletoras: 73.063 (funcionalidade imediata)	EM EXECUÇÃO	CT 30000406/2021	R\$ 14.124.418,62	-	-	-	R\$ 400.044,51	R\$ 400.044,51
Obs.: planilha atualizada em 31/03/2022.						R\$ 16.857.735,93	R\$ 50.065.439,69	R\$ 30.950.178,61	R\$ 9.113.828,48	R\$ 106.987.182,71

ÁGUA	R\$ 214.008,58	R\$ 6.278.353,81	R\$ 6.730.895,88	R\$ 1.331.495,07	R\$ 14.554.753,34
ESGOTO	R\$ 16.643.727,35	R\$ 43.787.085,88	R\$ 24.219.282,73	R\$ 7.782.333,41	R\$ 92.432.429,37



**ANEXO IV – Relação de Investimentos em Aquisições de Materiais e Equipamentos para Obras Previstas no PGP de Goiânia.**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS PREVISTAS NO PGP DE GOIÂNIA**

OBRA / META	CÓDIGO	PROCESSO	CONTRATO	OBJETO	STATUS	VALOR (R\$)	INVESTIMENTOS				
							2019	2020	2021	2022*	Antes de 2019
INTERMEDIÁRIO MÉIA PONTE JUSANTE E ETE PARQUE ATHENEU	E - 07a/12 E - 07b/12	18098/2015	744/2017	TUBOS - PVC	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 65.684,52					
		18098/2015	1006/2017	TUBOS - PVC	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 61.692,00					
		18098/2015	1054/2017	TUBOS - PVC	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 144.996,00					
		20679/2015	1055/2017	TUBOS - PVC	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 12.900,00					
		20679/2015	699/2017	TUBOS - FOFO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 1.155.980,00					
		20679/2015	1358/2017	TUBOS - FOFO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 19.836,00					
		20679/2015	1359/2017	TUBOS - FOFO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 2.458.290,28					
		12112/2017	1027/2018	GRADE E ROSCA	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 1.077.000,00					
		10077/2018	30000144/2019	GRADE GROSSA MECANIZADA	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 562.350,00					
		1050/2019	3000052/2020	CONEXÕES FPF	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 98.895,00					
		2909/2019	30000129/2020	CONEXÕES FPF	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 640.000,00					
		17261/2019	30000290/2020	TUBOS E CONEXÕES PRV	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 241.270,60					
		4386/2019	30000325/2020	TUBOS PRV (COMPLEMENTO)	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 210.725,40					
		4386/2019	30000318/2020	ESTEIRA TRANSPORTADORA	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 350.000,00					
		25719/2016	30000318/2020	CONJ. CX. DE ÁREA	EM FORNECIMENTO	R\$ 375.700,00					
		10613/2019	30000218/2020	PARAF. / ARRUELAS/ CONEX. FPF	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 744.997,13					
		24683/2015	30000072/2021	TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 939.993,42					
		10404/2020	30000109/2021	MEDIADORES DE VAZÃO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 244.460,00					
		15518/2020	30000159/2021	TUBOS ESG CONCRETO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 1.359.999,60					
		3187/2019	30000165/2021	SOPRADORES FTE PQ. ATHENEU	EM FORNECIMENTO	R\$ 3.995.000,00					
		13552/2020	30000214/2021	VALVULAS	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 248.000,00					
		11993/2020	30000223/2021	TUBOS E CONEXÕES EM FPF	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 2.447.849,40					
		8762/2017	30000289/2021	VALVULAS EM FPF	EM FORNECIMENTO	R\$ 269.520,00					
		24684/2015	3000286/2021	TUBOS EM AÇO CARBONO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 121.600,00					
		13648/2021	30000297/2021	GRADE FINA/CAÇAMBA/ESTEIRA/PONTE ROLANTE/GUINDASTE	EM FORNECIMENTO	R\$ 2.384.599,00					
		11224/2021	Em contratação	COMPORTAS EM AÇO INOX	EM FORNECIMENTO	R\$ 462.000,00					
		558/2019	30000304/2019	DIFUSORES ETE PQ. ATHENEU	EM INSTRUÇÃO (ORÇAMENTO)	R\$ 14.334.951,83					
		21117/2018	3000016/2020	VALVULAS	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 2.392.675,44					
		21117/2018	30000122/2020	MAT. HIDRAULICOS	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 54.711,72					
		21119/2018	30000184/2020	TUBOS E CONEXÕES EM FOFO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 3.498.999,80					
		13042/2018	30000212/2020	TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 2.649.991,62					
		21120/2018	30000233/2020	TUBOS E CONEXÕES EM FOFO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 5.668.898,36					
		18871/2018	30000265/2021	TUBOS E CONEXÕES EM PEAD	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 125.400,00					
20915/2018	3000034/2021	TUBOS E CONEXÕES EM PEAD	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 1.559.897,15							
15229/2018	3000096/2021	CENTRIFUGAS	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 3.400.010,00							
20250/2018	30000157/2021	COMPORTAS DE AÇO INOX	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 849.000,00							
15518/2020	30000158/2021	COLET. LODO COM REMOV. ESCUMA	EM FORNECIMENTO	R\$ 2.920.000,00							
1899/2019	30000131/2021	MEDIADOR DE VAZÃO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 281.275,00							
4253/2019	30000197/2021	SOPRADORES	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 9.000.000,00							
18868/2018	30000198/2021	VALVULAS	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 163.530,00							
4253/2019	30000199/2021	VALVULAS	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 206.840,00							
4253/2019	30000200/2021	TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, ARRUELAS E PARAFUSOS	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 500.956,40							
20600/2019	30000373/2021	MISTURADORES	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 1.660.999,98							
20011/2018	30000251/2021	VALVULAS	EM FORNECIMENTO	R\$ 109.980,00							
15906/2020	30000010/2022	TUBOS E CONEXÕES FERRO FUNDIDO E OUTROS	EM FORNECIMENTO	R\$ 141.000,00							
15906/2020	30000031/2022	SIST. PREPARO DE POLÍMERO	EM FORNECIMENTO	R\$ 598.800,00							
17524/2020	3000011/2021	BOMBAS	EM FORNECIMENTO	R\$ 2.560.000,00							
11076/2021	30000353/2021	BOMBAS	EM FORNECIMENTO	R\$ 267.000,00							
19056/2018	Em contratação	PONTES ROLANTES	EM FORNECIMENTO	R\$ 337.000,00							
14707/2019	Em contratação	TUBOS EM AÇO CARBONO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 75.365,28							
16572/2020	Em contratação	SIST. INERT, MIST. LODO E CAL, EST. TRANSP. ROSCA TRANSP.	FINALIZANDO INSTRUÇÃO	R\$ 1.393.717,08							
1024/2022	Em contratação	ANALISADORES DE PROCESSO	FINALIZANDO INSTRUÇÃO	R\$ 4.480.851,56							
13418/2021	Em contratação	DIFUSORES E BARRILETES - SISTEMA DE AERAÇÃO	EM ASSINATURA DE CONTRATO	R\$ 23.030.000,00							
13418/2021	Em contratação	BOMBAS - REMANESCENTES DO PROCESSO. 15906/2021	FINALIZANDO INSTRUÇÃO	R\$ 21.440,24							
13418/2021	Em contratação	BOMBAS TRANSPORTE DE LODO	FINALIZANDO INSTRUÇÃO	R\$ 180.000,00							
1014/2022	Em contratação	MATERIAIS TRANSPORTE DE LODO	FINALIZANDO INSTRUÇÃO	R\$ 195.920,35							
13836/2021	Em contratação	COMPORTA DE FIBRA DE VIDRO E ESCADA METALICA	FINALIZANDO INSTRUÇÃO	R\$ 50.000,00							
15996/2021	Em contratação	EQUIPAMENTOS PARA ENERGIZAÇÃO	FINALIZANDO INSTRUÇÃO	R\$ 2.319.644,98							
20660/2015	39/2018	EQUIPAMENTOS BOOSTER ETAG	FINALIZANDO INSTRUÇÃO	R\$ 8.851.090,30							
20679/2015	697/2017	TUBOS EM AÇO CARBONO DN 1628MM	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 8.644.680,00							
20679/2015	668/2017	TUBOS DE FERRO FUNDIDO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 2.190.720,00							
20679/2015	1357/2017	TUBOS - PVC	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 32.836,80							
18499/2021	Em contratação	TUBOS DE FERRO FUNDIDO	FORNECIMENTO CONCLUÍDO	R\$ 6.909.350,00							
		TUBOS E CONEXÕES EM FOFO	ENCAMINHADO PARA PREGÃO	R\$ 1.091.999,11							
				R\$ 133.402.871,35							
				R\$ 21.696.965,60							
				R\$ 562.350,00							
				R\$ 15.938.108,57							
				R\$ 16.072.417,83							
				R\$ 79.173.029,35							

\* Valores referentes a investimentos já realizados (status fornecimento concluído) ou previstos para serem realizados em 2022.  
Obs.: planilha atualizada em 31/03/2022.

ÁGUA	R\$ 17.777.586,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.945.089,41
ESGOTO	R\$ 3.919.378,80	R\$ 562.350,00	R\$ 15.938.108,57	R\$ 16.072.417,83	R\$ -	R\$ 69.229.939,94

**ANEXO V – Proposta de Revisão das Tabelas 08 (SAA) e 11 (SES) do PGP.**



**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA**  
**(Proposta de revisão da Tabela 8 do PGP)**

Regiões	Obras	Cronograma	Valor (R\$)
Centro/Sul	• Booster Cascalho – ampliação da capacidade de recalque, até o CR Pedro Ludovico - Vazão: 1.000 l/s.	2021	R\$ 7.090.000,00
	• Booster ETAG – conclusão da implantação - Vazão: 4.800 l/s.	2023	R\$ 13.284.763,53
	• AAT ETAG/ SENAC – duplicação da Adutora de Água Tratada - Extensão: 2.946 m, DN 1.626mm.	2022	
	• Linhão GYN/APA (Lote 1) - Elevatória SENAC: substituição da elevatória atual com aumento da capacidade de recalque de 1.500 l/s para 3.000 l/s. - AAT CR SENAC ao CR CELG: 1.668 m, DN 1.200mm.	2023	R\$ 9.520.225,33
	Booster e AAT João Leite ao CR Cristina (Conexão Cristina) • Booster João Leite - Vazão: 2.100 l/s. • Adutora de Água Tratada - Extensão: 4.793,25 m, DN 1.200mm.	2023	R\$ 38.770.400,00
	• Centro de Reservação Cristina - CR Apoiado: 10.000 m³.		
Noroeste / Sudoeste	• Rede de Distribuição - Conjunto Estrela Dalva I, Finsocial, Morada do Sol, Tremendão, Condomínio Fortaleza, Jardim Curitiba, Jardim Liberdade, Brisas da Mata, Estrela Dalva, Alto do Vale, Recanto do Bosque, Boa Vista, Floresta e São Domingos, Boa Vista, Floresta, Jardim Vitória e São Carlos.	2023	R\$ 5.574.518,95
	• Centro de Reservação - Curitiba 1: 2.667 m³. - Curitiba 2: 5.000 m³.	2022	R\$ 4.450.804,10
	• Adutora de Água Tratada - CR Recanto ao Caixa 1: DN 800 mm - Caixa 1 ao Caixa 2: DN 500 mm - Caixa 1 ao Jd. Cerrado: DN 400 mm - Caixa 2 ao CR São José: DN 700 mm - Caixa 2 ao Santa Rita: DN 500 mm - Caixa 3 ao Buena Vista: DN 500 mm • Centro de Reservação - Santa Rita: 2.100 m³ - São José: 3.000 m³ - Bertin Belchior: 2.000 m³ • Ressetorização de redes de distribuição - Extensão: 24 km.	2024	R\$ 38.795.112,70
	• Adutora de Água Tratada - Derivação ao CR Guanabara - CR Guanabara ao CR Ceasa - CR Ceasa ao CR Recreio do Ipê - CR Ceasa ao CR Minas Gerais - Derivação 6A ao Booster Vila Pedroso - Booster Vila Pedroso ao CR Vila Pedroso - Derivação 1D ao CR Itatiaia - CR Itatiaia ao CR Campus - CR Itatiaia ao CR Pompéia - CR Privê Itanhangá ao CR Orlando de Moraes • Centro de Reservação	2025	R\$ 79.084.936,27

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (Proposta de revisão da Tabela 8 do PGP)			
Regiões	Obras	Cronograma	Valor (R\$)
Leste/ Sudoeste	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceasa: 1.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Minas Gerais: 1.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Privê Itanhangá: 1.000 m<sup>3</sup></li> <li>• Elevatória/ Booster               <ul style="list-style-type: none"> <li>- EAT Guanabara ao CR Ceasa</li> <li>- EAT Ceasa ao CR Recreio do Ipê</li> <li>- Booster Vila Pedroso</li> <li>- EAT Itatiaia ao CR Campus</li> <li>- EAT Privê Itanhangá ao CR Orlando de Moraes</li> </ul> </li> </ul>		
	Linhão GYN/APA (Lote 2): CR CELG até o limite entre os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adutora de Água Tratada               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensão: 5.356,10 m, DN 1.500mm.</li> </ul> </li> <li>• Centro de Reservação               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gameleira: 10.000 m<sup>3</sup> (x2)</li> </ul> </li> </ul>	2026	R\$ 56.825.490,90
Norte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliação do Sistema de Produção de Água Mauro Borges para 6.000 l/s.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantação de módulo de tratamento na Estação Mauro Borges, ampliando a capacidade de tratamento de 4.000 L/s para 6.000 l/s.</li> </ul> </li> </ul>	2026	R\$ 30.600.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adutora de Água Tratada               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ETA Meia Ponte ao CR Paineiras: 9km, DN 800mm</li> <li>- CR Curitiba ao Booster Liberdade: 2km, DN 1.000mm</li> <li>- Booster Liberdade ao CR Solar Ville: 2,4km, DN 1.000mm</li> <li>- CR Solar Ville ao CR Recanto: 4,5km, DN 800mm</li> </ul> </li> <li>• Centro de Reservação               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paineiras: 5.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Recanto: 5.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Solar Ville: 5.000 m<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>• Booster Liberdade               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazão: 1.585 l/s.</li> </ul> </li> </ul>	2023	R\$ 15.000.000,00
	Rede de Abastecimento João Paulo II - Obra Direta	2020	R\$ 21.000,00
Estudo	Estudo Hidrológico da Região Metropolitana	2022	R\$ 1.757.712,77
Captação	Projeto do Sistema Produtor (barramento, tomada d'água, adutora de água bruta, estação elevatória e estação de tratamento)	2024	R\$ 5.000.000,00
	Obtenção de decreto/declaração de utilidade pública das áreas necessárias ao barramento	2024	R\$ -
	Início das Obras de Barramento do Sistema Produtor	2027	R\$ 141.346.153,84
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 447.121.118,40</b>

# SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

(Proposta de revisão da Tabela 11 do PGP)

Regiões	Obras	Cronograma	Valor (R\$)
Central	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliação ETE Hélio Seixo de Britto</li> <li>- Vazão: 2.200 l/s.</li> <li>- Tratamento Secundário.</li> </ul>	2022	R\$ 95.498.588,23
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacia Anicuns</li> <li>1ª Etapa</li> <li>- Redes Coletoras: 38,5 km.</li> <li>- 02 travessias sobre o Ribeirão Anicuns.</li> </ul>	2023	R\$ 3.060.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2ª Etapa</li> <li>- Redes Coletoras: 10,6 km.</li> <li>- 01 travessia sobre o Ribeirão Anicuns.</li> </ul>	2024	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliação ETE Hélio Seixo de Britto</li> <li>- Tratamento secundário com capacidade de 3.200 l/s, com instalação de tanques de aeração, sistema de aeração, decantadores secundários, estações elevatórias de recirculação do lodo, centrífuga de adensamento do lodo e subestação.</li> <li>- Implantação do Tratamento Terciário (Desinfecção).</li> </ul>	2026	R\$ 51.500.000,00
Noroeste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rede Coletora de Esgoto Jardim Nova Esperança/ Jardim Petrópolis</li> <li>• Rede Coletora de Esgoto</li> <li>- Extensão: 124.753 m.</li> </ul>	2021	R\$ 17.936.790,39
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Região Noroeste RCE Caveirinha + Interceptores/ RCE Meia Ponte Norte</li> <li>• Rede Coletora de Esgoto</li> <li>- Extensão: 147.000 m.</li> </ul>	2023	R\$ 59.152.407,91
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interceptores</li> <li>- Meia Ponte: 1.986 m.</li> <li>- Pinguela Preta: 9.770 m.</li> <li>• Estação Elevatória de Esgoto</li> <li>- Recanto do Bosque</li> </ul>	2024	
Norte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bacia João Leite</li> <li>• Elaboração de projeto para complemento da Bacia João Leite.</li> </ul>	2024	R\$ 41.200.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>RCE, interceptor, EEE Recanto das Minas Gerais e adjacências</li> <li>• Rede Coletora de Esgoto</li> <li>- Extensão: 70.115 m.</li> <li>• Interceptor</li> <li>- Extensão: 3.677 m.</li> </ul>	2025	
Sudeste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intermediário Meia Ponte Jusante</li> <li>• Estação Elevatória de Esgoto</li> <li>- MP04</li> <li>- Aruanã</li> <li>- Gameleira 1</li> <li>- Gameleira 2</li> <li>- Caiçara</li> <li>• Interceptores</li> <li>- Extensão: 9.508 m.</li> </ul>	2024	R\$ 26.146.251,73
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliação ETE Pq. Atheneu</li> <li>- Vazão: 600 l/s.</li> <li>- Ampliação e melhoria do tratamento preliminar e lagoa de decantação.</li> <li>- Implantação de sistema de aeração.</li> </ul>	2023	

## SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

(Proposta de revisão da Tabela 11 do PGP)

	<p>Intermediário Meia Ponte Montante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estação Elevatório de Esgoto               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criméia</li> <li>- Vila Viana</li> <li>- Jaó</li> <li>- Rasmussen</li> </ul> </li> <li>• Interceptores               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensão: 13.942 m.</li> </ul> </li> </ul>	2025	R\$ 15.035.000,00
	<p>ETE Parque Atheneu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratamento Terciário – Desinfecção.</li> </ul>	2026	R\$ 10.300.000,00
Sudoeste	<p>Bacia Dourados 1º Etapa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rede Coletora de Esgoto               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensão: 186.000 m.</li> </ul> </li> <li>• Interceptores               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensão: 8.325 m.</li> </ul> </li> <li>• Estação Elevatória de Esgoto               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baliza</li> <li>- Rodeio</li> </ul> </li> <li>• ETE Dourados               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazão: 200l/s.</li> </ul> </li> <li>• Rede Coletora de Esgoto Setor Garavelo B</li> </ul>	2026	R\$ 73.350.206,20
	<p>Bacia Dourados 2º Etapa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração de Projeto.</li> </ul>	2025	R\$ 1.678.285,50
Oeste	<p>Sistema Taquaral - Implantação de Redes Coletoras de Esgoto e Interceptores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacia Taquaral (Lote 1):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023: 73,1 km de redes coletoras.</li> <li>- 2026: 284,7 km de redes coletoras e 9,9 km de interceptores.</li> </ul> </li> <li>• Bacia Salinas (Lote 2):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2025: 210,6 km de redes coletoras e 8,9 km de interceptores.</li> </ul> </li> <li>• Bacia Cavalo Morto (Lote 3):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2027: 60,8 km de redes coletoras e 4,4 km de interceptores.</li> </ul> </li> <li>• Bacia Forquilha (Lote 4):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2027: 147,5 km de redes coletoras e 12,2 km de interceptores.</li> </ul> </li> </ul>	2027	R\$ 170.254.668,06
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 565.112.198,02</b>
